

黄河流域（片）

大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2015



水利部黄河水利委员会
YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

黄河流域（片） 大型生产建设项目水土保持公报

SOIL AND WATER CONSERVATION BULLETIN
ON LARGE-SCALE PRODUCTION AND CONSTRUCTION
PROJECTS IN YELLOW RIVER BASIN

2015

水利部黄河水利委员会
YELLOW RIVER CONSERVANCY COMMISSION OF MWR

根据《中华人民共和国水土保持法》和《水利部流域管理机构生产建设项目水土保持监督检查办法（试行）》，2015年，由水利部黄河水利委员会组织，青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西、山西、河南、山东、新疆等9省（自治区）、新疆生产建设兵团水行政主管部门以及黄河上中游管理局，对黄河流域（片）水利部批复水土保持方案的在建大型生产建设项目水土保持工作全部进行了监督检查，重点检查了各项目水土保持“三同时”制度执行情况以及国家相关管理规定落实情况，包括水土保持方案变更与后续设计、取弃土场选址与防护、水土保持措施实施、水土保持监测与监理、水土保持设施验收等。为了强化水土保持监督管理，遏制人为水土流失，保护生态环境，建设生态文明，现将检查结果公布如下：



黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						一、青海省水利厅检查项目		
1	青海省湟水北干渠扶贫灌溉一期工程	青海省引大济湟建设管理局	水保函[2004]333号	2015-8-24	青海省水土保持生态环境监测总站	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测。植物措施实施滞后，水土保持监测及方案实施情况报告制度未落实，水土保持档案资料不全面，应抓紧整改，并做好水土保持设施验收准备。		
2	新建敦煌至格尔木铁路（青海段）	青藏铁路公司	水保函[2010]328号	2015-9-10		主体工程完成95%，水土保持工程措施完成85%，植物措施尚未实施。开展了水土保持设计。未开展水土保持监测和监理。存在弃渣场边坡过陡、防治措施体系不完善和植物措施严重滞后等问题。应尽快开展水土保持监测和监理，依法缴纳水土保持补偿费，并抓紧整改存在的问题。		
3	青海海西花土沟民用机场项目	西部机场集团青海机场有限公司	水保函[2013]315号	2015-9-11	长江流域水土保持监测中心站	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收工作。应加快植物措施实施进度，并做好水土保持设施验收准备。		
4	青海省果洛民用机场项目	西部机场集团青海机场有限公司	水保函[2013]456号	2015-8-13	青海省水土保持生态环境监测总站、长江流域水土保持监测中心站	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分取土场周边截排水设施不完善，坡面侵蚀较为严重，已造成水土流失；航站区附属设施区临时堆土未进行集中堆放和采取临时防护措施。应按要求抓紧整改。		
5	青海海东佑宁750千伏输变电工程	国网青海省电力公司	水保函[2014]159号	2015-8-24		主体工程完成35%，水土保持工程措施完成20%，植物措施尚未实施。未开展水土保持监测和监理。应加快植物措施实施进度，全面落实各项防治措施；尽快开展水土保持监测和监理工作，依法缴纳水土保持补偿费。		
6	青海省贵德县拉西瓦灌溉工程	贵德县拉西瓦工程建设管理局	水保函[2014]185号	2015-8-14		主体工程完成60%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计。未成立水土保持管理机构，未开展水土保持监测和监理。3#弃渣场存在乱堆乱弃、边坡过陡、浆砌石挡墙较低以及无截排水措施等问题，4#弃渣场排水涵管堵塞，拦渣坝被冲损毁，沟口淤积，影响行洪安全；5#弃渣场未按照设计位置进行弃渣；各施工（含临时）道路排水设施不完善。应尽快成立水土保持管理机构，开展水土保持监测和监理工作，并按要求抓紧整改问题。		
7	青海万象铝镁有限公司2×350MW热电联产工程	青海万象铝镁有限公司	水保函[2014]208号	2015-8-19		主体工程正在进行场平工作，水土保持措施尚未实施。开展了水土保持设计。未开展水土保持监测和监理，应抓紧落实，并依法缴纳水土保持补偿费，及时落实各项水土保持措施。		


黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
二、甘肃省水利厅检查项目								
1	兰州至海口国家高速公路临洮至渭源段工程	甘肃路桥公路投资有限公司	水保函[2010]03号	2015-9-11	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测。取弃土场位置和数量发生变更，未履行相关变更手续；未实施拦挡、苫盖、洒水等临时防护措施，水土保持工程和植物措施落实也不到位，存在较为严重的水土保持违法违章行为；未依法缴纳水土保持补偿费。应尽快完成水土保持设计，开展水土保持监理工作，按要求抓紧整改存在问题，全面落实各项水土保持措施。		
2	十堰至天水国家高速公路甘肃省段徽县(大石碑)至天水高速公路	甘肃省高等级公路建设开发有限公司	水保函[2010]251号	2015-7-15	甘肃省水土保持科学研究所	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。未严格落实水土保持方案，部分水土保持措施实施缓慢，水土保持后续设计滞后；部分取弃土场位置和数量发生变更，未履行相关变更手续；部分施工单部位水土保持法律意识淡薄，存在较为严重的水土保持违法违章行为；未依法缴纳水土保持补偿费；水土保持监理单位未有效履行职责。应抓紧整改，依法全面履行水土流失防治义务。		
3	新建敦煌至格尔木铁路(甘肃段)	兰州铁路局敦煌铁路有限责任公司	水保函[2010]328号	2014-7-10	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计和监测，正在开展水土保持设施验收评估工作。施工道路截(排)水设施不断完善，水毁情况严重，道路沿线零星堆土较多；当金山进口弃渣场未削坡开级，形成高陡边坡，存在安全隐患；未依法缴纳水土保持补偿费；水土保持报告制度未落实。应开展全线排查，对存在的问题限期整改；对位于行洪河道的弃土(渣)场，要完善相关手续，并落实相应的水土流失防治措施。		
4	甘肃省甘南州临潭县引洮入潭工程	临潭县引洮入潭工程建设管理处	水保函[2011]146号	2015-9-14	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成50%。开展了水土保持监测和监理。弃土(渣)场增加但未履行变更手续；部分弃渣场堆渣过陡过高，且未实施拦挡和截排水等措施，存在严重的水土流失隐患；净水厂防治区的临时堆土及渣场防治区集中堆放的表土未实施临时排水、拦挡、苫盖等临时防护措施。应抓紧整改，并做好临时防护措施影像资料的收集归档工作。		
5	华能甘肃能源开发有限公司新庄矿井及选煤厂项目	华能甘肃能源开发有限公司	水保函[2011]232号	2015-9-10	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成85%。开展了水土保持设计、监测和监理。工业场地位外非水顺接工程施工进度缓慢，已实施的排水渠不完善，存在水土流失隐患，厂区内的表土剥离堆放区临时拦挡和苫盖措施未实施。应抓紧整改，并完善临时防护措施的档案和影像资料。		
6	甘肃省甘南藏族自治州引洮(博)济合供水工程	合作市水务水电局	水保函[2011]298号	2015-9-13		主体工程完成30%，水土保持工程措施完成15%，植物措施完成10%。未开展水土保持设计、监测和监理。弃渣场位置发生变化，未履行相关变更手续；水土保持措施实施进度缓慢，弃渣场未落实“先拦后弃”原则，未修建挡墙和截排水设施，临时弃渣未采取苫盖、挡挡措施；扎沙沟存在随意弃渣，侵占沟道，影响行洪安全的问题。应尽快开展水土保持监测和监理，履行弃土弃渣场变更手续，并按要求进行整改。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
7	京新国家高速公路 (G7)甘肃段白疙瘩至 明水公路工程	甘肃省远大路业集 团有限公司	水保函 [2012]327号	2015-7-11		主体工程完成10%，水土保持工程措施完成5%，植物措施尚未实施。未开展水土 保持设计、监测和监理。水土保持临时防护措施落实不到位，未落实水土保持工作报 告制度，未依法缴纳水土保持补偿费。应按要求抓紧整改，依法认真落实水土保持方案。		
8	甘肃白银热电新建项 目	靖煤集团白银热电 有限公司	水保函 [2013]192号	2015-9-7	广东粤源水利水电工 程咨询有限公司	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成70%。开展了水土 保持监测和监理。施工现场随意堆土，未采取临时挡土、苫盖、排水等措施；厂区内 有裸露土地，存在水土流失隐患。应按要求抓紧整改，全面落实各项水土保持措施。		
9	甘肃万胜矿业有限公 司甜水堡煤矿二号井 建设工程	甘肃万盛矿业有限 公司	水保函 [2014]49号	2015-9-8	陕西省水利水电勘测 设计院	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成30%。开展了水土 保持监测和监理。排矸场位置发生变化，未履行相关变更手续，未完善水土保持措施 后续设计；部分水土保持措施实施进度缓慢，工业场址防治区的护坡、截水措施未实 施，爆破材料库工程防治区的排水设施不完善，厂区植物措施带后。应按要求抓紧整 改，并加快水土保持措施实施进度。		

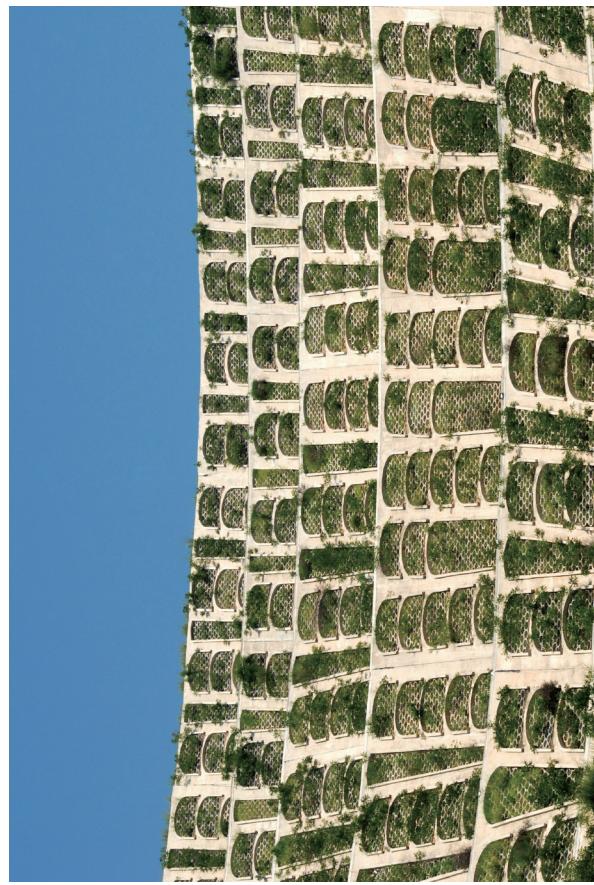

高陡边坡分级综合防护



边坡临时苫盖及排水措施

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
三、宁夏回族自治区水利厅检查项目								
1	宁夏银川兵沟黄河大桥及连接线工程	银川交通运输局	水保函[2010]208号	2015-10-14	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成74%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。存在开挖土方临时堆放无序，取土场水土流失防治责任不明确等问题。应抓紧整改，加强临时防护措施，适时实施植物措施，并尽快落实采取土场防治责任和措施。		
2	神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化示范项目（宁夏沙索煤炭间接液化项目）	神华宁夏煤业集团有限公司	水保函[2010]223号	2015-10-10	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理。应适时做好扰动区域植被恢复治理，减少地表裸露时间，降低风蚀影响，进一步落实水土保持方案确定的各项水土流失防治措施，依法缴纳水土保持补偿费。		
3	西气东输三线天然气管道工程西段（霍尔果斯—中卫）（宁夏段）	中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司	水保函[2012]12号		黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成95%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。应全面完成水土流失防治任务，并做好水土保持设施验收准备。		
4	宁东—浙江±800kV特高压直流输电工程（宁夏段）	国网宁夏电力公司、国家电网公司直属建设分公司	水保函[2013]143号	2015-10-16 2015-10-28	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成40%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成35%。开展了水土保持设计、监测和监理，已委托水土保持设施验收评估工作。应加强施工中的临时洒水、苫盖等防护措施，做好场区边坡的削坡和整治，并适时开展扰动区域植被恢复治理，减少地表裸露时间，降低风蚀影响。		
5	青银高速公路银川至宁东段改扩建工程	宁夏回族自治区交通运输厅	水保函[2013]267号	2015-10-10	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测，应抓紧落实。加强对施工中的临时洒水、苫盖等防护措施，做好场区边坡的削坡和整治，并适时开展扰动区域植被恢复治理，减少地表裸露时间，降低风蚀影响。		
6	神华国能宁夏煤电有限公司鸳鸯湖电厂二期（2×1000MW）扩建工程	神华国能宁夏煤电有限公司	水保函[2014]375号	2015-10-10	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成20%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成5%。开展了水土保持设计、监测和监理，已委托水土保持设施验收评估工作。应进一步加强对施工单位的管理，减少地表扰动，加强对施工中的临时洒水、苫盖等防护措施，做好场区边坡的削坡和整治，并适时开展扰动区域植被恢复治理，减少地表裸露时间，降低风蚀影响。		
7	宁夏回族自治区红墩子矿区红四煤矿项目	宁夏宝丰能源投资集团有限公司	水保函[2014]419号	2015-10-13	宁夏回族自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理。应进一步加强对施工单位的管理，优化施工组织及工艺，尽可能减少地表扰动；全面落实水土保持方案确定的各项水土流失防治措施，特别要加强矸石场的水土流失防治工作，做到先挡后弃，有序堆放。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						四、内蒙古自治区水利厅检查项目		
1	黄河内蒙古河套灌区续建配套与节水改造一期工程	内蒙古河套灌区管理局	水保函[2001]103号	2015-9-11		主体工程完成15%，水土保持工程和植物措施尚未实施。未开展水土保持监测和监理。施工过程中存在乱压乱碾、滥挖滥弃现象。应加强施工管理，严控施工范围；抓紧开展水土保持监测和监理工作；及时落实各项水土保持措施。		
2	神华集团塔然高勒矿井工程	神华集团杭锦能源有限责任公司	水保函[2006]343号	2015-7-23	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。排矸场治理措施不到位，厂区及造煤厂边坡未治理，应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施；加强施工管理，完善临时防护措施；抓紧做好水土保持设施验收准备。		
3	中天合创能源有限责任公司门克庆矿及选煤厂	中天合创能源有限责任公司	水保函[2008]356号	2015-7-23	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成75%。开展了水土保持设计、监测和监理。运输道路、主副井工业场地等区域未及时落实水土保持措施，应抓紧整改；加强施工管理，落实临时防护措施；规范和强化水土保持监测和监理工作；落实水土保持工作报告制度；做好水土保持设施验收准备。		
4	中天合创能源有限责任公司葫芦素矿井(含选煤厂)工程	中天合创能源有限责任公司	水保函[2008]361号	2015-7-21	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理。工程完建区域水土保持措施滞后；临时防护措施不到位；排矸场位置发生重大变更，但未履行变更手续；水土保持监测和监理作用未有效发挥。应抓紧整改，切实落实各项水土保持措施，做好水土保持设施验收准备。		
5	新建铁路乌拉山至锡尼线	鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司	水保函[2009]206号	2015-7-23	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理。施工场地、预制场、拌合场等临建场地未及时清理整治；取土场、弃土场植物措施未实施；存在一些施工区域乱堆、乱弃现象；水土保持监测和监理工作未有效发挥作用。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，及时申请水土保持设施验收。		
6	乌审旗蒙格沁能源开发有限责任公司梅林庙煤矿	神华包头矿业公司	水保函[2011]356号	2015-7-21		主体工程处于停工状态。复工后应及时通知当地水土保持主管部门；明确水土保持工作管理机构和人员；及时开展水土保持监测和监理工作，按要求报送水土保持监测报告；加强施工管理，尽量减少地表扰动和占压，注重临时防护措施，杜绝乱堆乱弃；严格落实水土保持“三同时”制度；若主体工程规模、位置、征占地、土石方量等发生重大变化，应向原水土保持方案批复机关申请水土保持方案变更。		
7	桑根达莱(白音高勒)500kV输变电工程	内蒙古超高压供电局	水保函[2012]383号	2015-7-23	内蒙古水利科学研究院	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计、监测和监理。应抓紧落实变电站内外水土保持措施；及时实施施工道路及施工生产生活区的扰动范围；规范和加强水土保持监测和监理工作。		
8	乌海至吉兰太Ⅱ回500千伏线路工程	内蒙古超高压供电局	水保函[2012]384号	2015-8-21	中国水利水电科学研究院	主体工程完成96%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成90%。开展了水土保持设计、监测和监理。施工现场、取土场、临时施工便道等区域水土保持措施不完善；弃渣场水土保持措施未落实；取土场交叉利用，责任不清。应抓紧整改，明确责任，尽快完善各项水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费；做好水土保持设施验收准备。		51

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成80%。开展了水土保持设计、监测和监理。应抓紧落实实塔基区、临时施工道路区、变电站区等裸露地的水土保持措施，进一步规范水土保持监测和监理工作，做好水土保持设施验收准备。	主体工程完成30%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成20%。未开展水土保持监测和监理。现场乱碾压现象严重；施工场地、拌合场及临时道路等使用结束后未及时清理整治；取土场未削坡、覆土及恢复植被。应加强施工管理，严格控制施工扰动；及时清理整治施工迹地；及时落实各项水土保持措施；抓紧开展水土保持监测和监理工作，依法缴纳水土保持补偿费。	
9	武川至察右中旗500千伏输变电工程	内蒙古超高压供电局	水保函[2012]392号	2015-7-24	内蒙古水利科学研究院			
10	改建铁路干塘至武威南铁路增建二线工程（内蒙古段）	兰州铁路局干塘至武威建设指挥部	水保函[2013]181号	2015-8-13				
11	内蒙古巴彦淖特热电联产项目	内蒙古哈伦能源有限公司	水保函[2013]216号	2015-8-11	黄河水域水土保持生态环境监测中心			



采气井场周边沙障防护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称 建设单位	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						五、陕西省水利厅检查项目		
1	改建铁路西安至安康 线增建第二二线	西安铁路局	水保函[2008]115号	2015-10-30	陕西省水土保持监测 中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成90%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃渣场水土保持措施不完善，应抓紧整改，做好水土保持设施验收准备。		
2	新建铁路宝鸡至兰州 客运专线（陕西段）	西兰铁路客运专线 陕西有限公司	水保函[2009]183号	2015-10-27	黄河流域水土保持生 态环境监测中心	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成10%。开展了水土保持设计、监测和监理。植物措施严重滞后，且进展缓慢，部分弃渣场防治措施不到位。应抓紧整改，并做好水土保持设施验收准备。		
3	宁西铁路西安至合肥 段增建第二线工程(陕 西段)	西安铁路局西安第 二工程指挥部	水保函[2010]249号	2015-6-8	陕西省水电勘测设计 研究院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃渣场排水措施不到位；大部分弃渣场复垦或植物措施不到位。应抓紧整改，并做好水土保持设施验收准备。		
4	陕西正通煤业有限责 任公司彬长矿区高家 堡矿井及选煤厂	陕西正通煤业有限 责任公司	水保函[2011]186号	2015-9-6	黄河流域水土保持生 态环境监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成85%。开展了水土保持设计、监测和监理。应完善各项水土保持措施，做好水土保持设施验收准备。		
5	陕西华电杨凌热电 厂小新建项目	陕西华电杨凌热电 有限公司	水保函[2011]365号	2015-10-28	中国科学院水利部水 土保持研究所	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成65%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分水土保持临时措施不完善，植物措施滞后。应抓紧完善各项水土保持措施，加快排矸场建设。		
6	陕西省金堆城钼业股 份有限公司王家坪尾 矿库项目	金堆城钼业股份有 限公司	水保函[2012]190号	2015-5-14		主体工程完成20%，水土保持工程措施完成10%，植物措施未实施。未开展水土保持设计、监测和监理，应抓紧落实，并完成水土保持设计报备工作；加强临时防护措施，严格落实各项水土保持措施。		
7	彬县煤炭有限责任公 司雅店矿井及选煤厂	彬县煤炭有限责任 公司	水保函[2012]233号	2015-4-15		主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。未开展水土保持监测和监理。目前主体工程处于停工状态。若复工，应尽快开展水土保持监测和停工监理工作，严格落实各项水土保持措施。		
8	西安南750kV输变电 工程	陕西省电力公司	水保函[2013]113号	2015-10-30	黄河流域水土保持生 态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持措施基本完成。应及时申请水土保持设施验收。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

88

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复工文号	检查时间	水土保持监测单位	2015年水土保持工作开展情况	备注
六、山西省水利厅检查项目							
1	新建铁路朔州至准格尔铁路工程(山西段)	准朔铁路有限责任公司	水保函[2006]145号	2015-6-25	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成68%。开展了水土保持监测和监理。新增取、弃土场未履行变更手续；部分渣场防治措施未实施。应抓紧整改，落实各项水土保持设施验收准备。	
2	国家高速公路网荣成—乌海公路山西境山阴—平鲁段工程	山西省交通运输厅朔州市高速公路建设管理处	水保函[2008]151号	2015-6-30	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成93%，植物措施完成65%。开展了水土保持监测和监理。弃渣场、取土场等数量和位置发生较大变化，但未履行变更手续。应尽快完成水土保持设施各项水土保持措施，抓紧实施后评价设计，完善变更手续，按要求提交水土保持监测总结报告；做好水土保持设施自查初验工作，并及时申请验收。	
3	山西沁水煤层气田枣园开发项目	格瑞克能源（国际）有限责任公司（中联煤层气有限公司）	水保函[2008]239号	2015-7-1		主体工程完成55%，水土保持工程措施完成45%，植物措施完成20%。未开展水土保持设计、监测和监理，应抓紧落实，并严格按照水土保持方案确定的各项水土保持措施，依法缴纳水土保持补偿费。	
4	山西晋城潘庄区块煤层气资源开采项目	中联煤层气有限责任公司	水保函[2008]285号	2015-7-2	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理。应严格落实水土保持方案确定的各项水土保持措施，依法缴纳水土保持补偿费。	
5	山西文峰（2×300MW）煤矸石综合利用电厂工程	山西国峰煤电有限责任公司	水保函[2009]300号	2015-7-15	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成75%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理。应抓紧落实各项水土保持措施，依法缴纳水土保持补偿费。	
6	龙源宁武余庄9万千瓦风力发电项目	龙源宁武风力发电有限公司	水保函[2013]141号	2015-7-16		主体工程完成50%，水土保持工程和植物措施基本未实施。未开展水土保持设计、监测和监理，应抓紧落实，并按照水土保持方案尽快落实各项目水土保持措施。	



弃土平整复垦及绿化

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备 注
						七、河南省水利厅检查项目		
1	南水北调中线一期工程（河南段）	河南省南水北调中线工程建设管理局	水保函[2007]177号	2015-7-5	河南省水土保持监督监测站	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成95%。开展了水土保持设计、监测和监理。应抓紧完善各项水土保持措施，及时申请水土保持设施验收。		
2	三门峡火电厂三期2×1000MW机组扩建工程	大唐三门峡电力有限公司	水保函[2009]278号	2015-6-12		主体工程完成70%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成10%。未开展水土保持监测和监理，应抓紧落实；临时防护措施不到位，应抓紧完善，并及时落实各项水土保持措施。		
3	华能渑池电厂2×3000MW热电联产工程	华能渑池热电有限责任公司	水保函[2010]156号	2015-6-12		主体工程完成70%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成20%。未开展水土保持设计和监理，应抓紧落实；临时防护措施不到位，应抓紧完善，并及时落实各项水土保持措施。		
4	锦州—郑州成品油管道工程（河南段）	中国石油天然气股份有限公司管道建设分公司项目经理部	水保函[2011]363号	2015-7-7	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理。施工过程中部分临时堆土的防护措施不完善，应抓紧整改。		
5	连霍高速公路兰考至刘江段改扩建工程	河南德郑高速公路有限公司	水保函[2012]135号	2015-6-10	黄河水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成90%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分路基边坡水土保持措施未落实，应抓紧整改，并做好水土保持设施验收准备。		
6	宁东—浙江+800kV特高压直流输电工程（河南段）	国网电力公司河南分公司	水保函[2013]143号	2015-7-22		主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持设计和监理。未开展水土保持监测；部分塔基、施工道路区植物措施未落实。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并做好水土保持设施验收准备。		
7	河南新中益电厂上大压小2×600MW超临界机组工程	河南新中益电力有限公司	水保函[2013]211号	2015-3-6		主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成90%。开展了水土保持设计和监理。未开展水土保持监测，应抓紧整改；部分塔基、施工道路区植物措施未到位，应尽快完善；依法缴纳水土保持补偿费；做好水土保持设施验收准备。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编号	项目名称	项目法人或建设单位	水土保持方案批复工号	检查时间	水土保持监测单位	2015年水土保持工作开展情况	备注
八、山东省水利厅检查项目							
1	莱芜电厂1×1000MW上大压小工程	华能莱芜发电有限公司	水保函[2010]140号	2015-9-29	山东省水利科学研究院	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理。厂区周边河道内有部分弃土未及时清理；厂区内地植物措施进度较慢；临时道路未采取苫盖、拦挡、洒水等临时措施。应抓紧整改，全面落实各项水土流失防治措施。	
2	新建铁路石家庄至济南客运专线	石济客运专线有限公司	水保函[2010]322号	2015-9-29		主体工程完成38%，水土保持工程措施完成30%，植物措施完成2%。尚未开展水土保持监测和监理。施工过程中临时措施不完善，临时堆土未及时清理或实施苫盖、拦挡等防护措施，植物措施基本未开展。应抓紧开展水土保持监测和监理工作，全面落实各项水土流失防治措施。	
3	日照至东明高速公路东明黄河大桥	山东大轴蒂黄河大桥建设投资有限公司	水保函[2011]153号	2015-5-5		主体工程完成33%，水土保持工程措施完成12%，植物措施完成2%。尚未开展水土保持监测。目前项目处于停工状态。	
4	山东国电泰安热电厂“上大压小”新建项目	山东国电泰安热电厂	水保函[2012]180号	2015-6-10	淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分弃土弃渣边坡防护及截排水措施不完善，临时苫盖、拦挡防护措施不到位；道路施工及其他工程施工防尘措施不及时；铁路专用线部分完工段未及时采取水土保持加固稳定路面。应抓紧整改，全面落实各项水土流失防治措施。	
5	山东省引黄济青改扩建设工程	山东省胶东调水局	水保函[2012]175号	2015-9-28		主体工程完成30%，水土保持工程措施完成30%，植物措施未实施。尚未开展水土保持监测和监理工作。应抓紧整改，并全面实施各项水土流失防治措施。	



变电站碎石压盖



集气站内外水土保持

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						九、新疆维吾尔自治区水利厅检查项目		
1	改建铁路南疆线吐鲁番至库尔勒段增二线工程	乌鲁木齐铁路局	水保函[2006]385号	2015-7-25	新疆维吾尔自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分弃渣场和施工道路临时防护措施不到位。应认真落实临时防护措施，加快植物措施实施进度，做好水土保持设施验收准备。		
2	哈密铁路地区货车南环线工程	乌鲁木齐铁路局	水保函[2010]92号	2015-6-22	新疆维吾尔自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设施验收评估工作。应尽快申请水土保持设施验收。		
3	新疆昌吉英格玛煤电投资有限责任公司奇台西黑山露天煤矿(6.00Mt/a)工程	新疆昌吉英格玛煤电投资有限责任公司	水保函[2010]194号	2015-7-22		主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理。目前项目停工。		
4	华威和田热电厂2×135MW工程	华威和田热电厂	水保函[2010]346号	2015-5-20	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理。施工现场管理较为混乱，存在乱堆乱弃现象。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施。		
5	新疆华电喀什二期(2×350MW)热电联产扩建工程	发电有限公司	水保函[2010]417号	2015-9-11	新疆维吾尔自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设施验收。	2015年10月30日水土保持设施已通过验收。	
6	连霍国家高速公路联络线G3012阿克苏至喀什段	新疆交通建设管理局	水保函[2011]133号	2015-8-4	交通运输部科学研究院	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理，已委托水土保持设施验收评估工作。植物措施严重滞后，部分取(弃)土场、施工生活区的恢复没达到要求，应抓紧整改，并及时申请水土保持设施验收。		
7	连霍国家高速公路联络线G3015克拉玛依—塔城(巴克图)段工程	新疆交通建设管理局	水保函[2011]139号	2015-8-5	交通运输部科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成80%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分弃渣场防治措施不到位，应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并及时申请水土保持设施验收。		
8	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司南疆钢铁基地项目	宝钢集团新疆八一钢铁有限公司	水保函[2011]280号	2015-6-20		主体工程完成60%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成30%。未开展水土保持监测和监理。应抓紧整改，加快植物措施实施进度，全面落实各项水土保持措施。		


黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况


编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	2015年水土保持工作开展情况		备注
					水土保持 监测单位		
9	750千伏伊利~库车~巴音郭楞输变电工程（750千伏库车~巴音郭楞输变电工程部分）	国网新疆经济研究院建设管理中心	水保函[2011]318号	2015-8-10	水利部水土保持监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分施工道路堆土未及时清理平整，应抓紧整改，并尽快申清水土保持设施验收。	
10	西气东输三线天然气管道工程西段（霍尔果斯-中卫）（新疆段）	中国石油天然气股份有限公司西部管道分公司	水保函[2012]12号	2015-8-12	水利部水土保持监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理。应加快植物措施实施进度，并做好水土保持设施验收准备。	
11	新疆克孜河卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	新疆卡拉贝利水利枢纽工程建设管理局	水保函[2012]30号	2015-8-15		主体工程完成10%，水土保持工程措施完成5%，植物措施完成5%。开展了水土保持设计和监理，尚未开展水土保持监测。应尽快开展水土保持监测工作，并严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	
12	新疆吉音水利枢纽工程	新疆吉音水利枢纽工程项目建设管理局	水保函[2012]83号	2015-8-17	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成40%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计、监测和监理。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应加强施工管理，规范施工行为。	
13	新疆富蕴民用机场迁建项目	富蕴蓝天机场劳务管理有限责任公司	水保函[2012]236号	2015-9-6	新疆水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施技术评估工作。应及时申请水土保持设施验收。	
14	国网能源新疆准东煤电有限公司准东煤田大井矿区二号矿井及选煤厂	国网能源新疆准东有限公司	水保函[2012]246号	2015-5-21		主体工程完成50%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成40%。尚未开展水土保持监测和监理。存在个别弃土弃渣乱堆乱放现象。应抓紧落实所有弃渣场、取土场、施工道路、施工场地等区域防治措施，尽快开展水土保持监测和监理工作。	
15	华能新疆能源开发有限公司准东煤田大井矿区六号矿井	华能新疆能源开发有限公司	水保函[2012]271号	2015-5-22		主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理。目前项目停工。	
16	新疆准东五彩750千伏输变电工程	国网新疆经济研究院建设管理中心	水保函[2012]290号	2015-8-16	水利部水土保持监测中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成60%。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。施工道路临时防护措施不到位，部分线路段存在乱堆乱弃现象。应严格按照批复的水土保持方案落实各项水土保持措施。	
17	世界银行贷款可持续发展农业项目	新疆维吾尔自治区农业综合开发领导小组办公室	水保函[2013]169号	2015-7-22		主体工程完成30%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成10%。未开展水土保持监测和监理。应严格按照水土保持方案落实各项水土保持措施，并尽快开展水土保持监测和监理工作。	
18	新疆库车~阿克苏~巴楚~喀什750千伏输变电工程（阿克苏~巴楚~喀什段）	国网新疆经济研究院建设管理中心	水保函[2013]3号	2015-6-20	水利部水土保持监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分施工道路堆土未及时清理平整，应抓紧整改，并尽快申清水土保持设施验收。	

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
19	750千伏伊犁～库车～巴音郭楞输变电工程（750千伏伊犁～库车输变电工程部分）	国网新疆经济研究院建设管理中心	水保函[2013]21号	2015-7-20	水利部水土保持监测中心	主体工程完成40%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成5%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分施工道路堆土未及时清理平整，水土保持工程措施和植物措施严重滞后。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施。		
20	新疆库车～阿克苏～巴楚～喀什750千伏输变电工程（库车～阿克苏段）	国网新疆经济研究院建设管理中心	水保函[2013]22号	2015-7-20	水利部水土保持监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分施工道路堆土未及时清理平整，应抓紧整改，并尽快申请水土保持设施验收。		

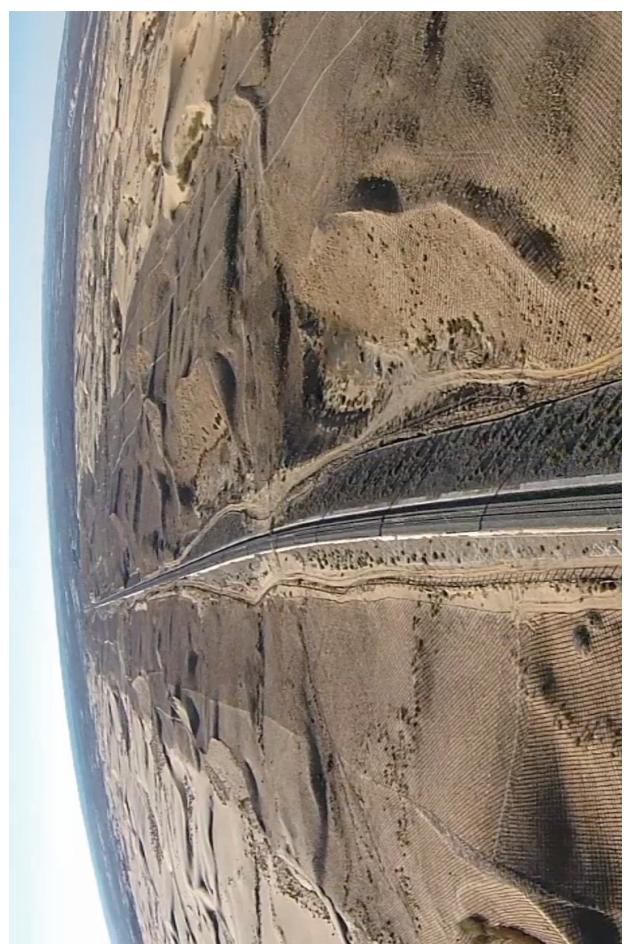

沙漠铁路两侧沙障防护带

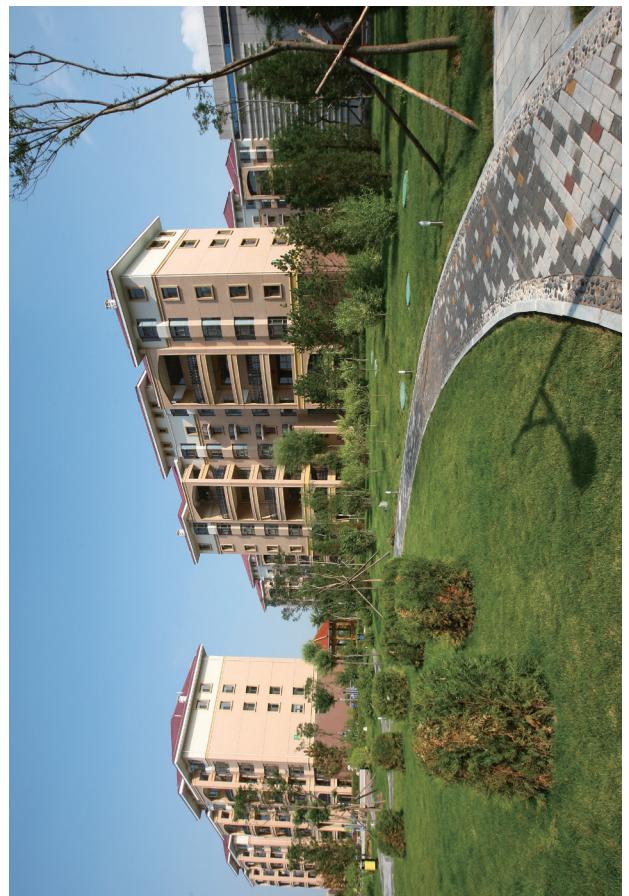

煤矿生活区绿化

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
十、新疆生产建设兵团水利局检查项目								
1	新疆兵团南疆新建团场项目未垦区苏博灌区水利工程（一期）——灌区工程	农二师38团建设管理局	水保函[2007]70号	2015-5-27	新疆生产建设兵团水土保持监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设施验收评估工作。应尽快申请水土保持设施验收。		
2	新疆玛纳斯河肯斯瓦特水利枢纽工程	新疆农八师玛纳斯河肯斯瓦特水利枢纽工程建设管理局	水保函[2009]101号	2015-5-27	新疆生产建设兵团水土保持监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持设计、监测和监理。大量弃渣堆放在主坝下游河道管理范围，未修建任何拦渣措施。应抓紧整改，尽快落实各项水土保持措施，并做好水土保持设施验收准备。		
3	新疆石河子机场迁建工程	石河子市支线机场建管处	水保函[2011]98号	2015-5-28	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成60%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。飞行区植物措施未实施，应抓紧整改。		
4	农十师北屯市热电联产项目	新疆屯富热电有限公司	水保函[2012]98号	2015-5-19	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计、监测和监理。应加快植物措施实施进度，依法缴纳水土保持补偿费。		
5	新疆叶尔羌河中游渠首农三师前海总干渠配套工程	新疆生产建设兵团第三师水利工程建设管理处	水保函[2013]336号	2015-5-21	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成20%，水土保持工程措施完成10%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。未依法缴纳水土保持补偿费。应按照批复的水土保持方案认真落实各项水土保持措施，并及时缴纳水土保持补偿费。		
6	湖北能源五星热电联产新建工程	新疆楚星能源发展有限公司	水保函[2014]158号	2015-5-15	北京地拓科技发展有限公司	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计、监测和监理。应加快植物措施实施进度，依法缴纳水土保持补偿费。		
7	新疆图木舒克民用机场项目	图木舒克机场建设有限责任公司	水保函[2014]383号	2015-5-20		主体工程完成60%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成20%。未开展水土保持监测和监理，未依法缴纳水土保持补偿费。应抓紧开展水土保持监测和监理工作，加快水土保持措施实施进度，依法缴纳水土保持补偿费。		
8	新疆叶尔羌河防洪工程	新疆生产建设兵团第三师水利工程建设管理处	水保函[2014]448号	2015-5-21		主体工程完成20%，水土保持工程措施完成10%，植物措施尚未实施。开展了水土保持监测，未开展水土保持监理。应按照批复的水土保持方案认真落实各项水土保持措施，并及时开展水土保持监测工作。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保 持监 测单 位	2015年水土保持工作开展情况		备 注
十一、黄河上中游管理局检查项目								
1	京藏高速茶卡至格尔木段工程	青海省公路建设管理局	水保函[2011]56号	2015-8-27	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成97%，水土保持工程施工措施完成80%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。存在植物措施建设滞后，部分取土场整治不到位等问题。应加快植物措施实施进度，完善取、弃土（渣）场防治措施，加快施工生产生活区清理整治，做好水土保持设施验收准备。		
2	青海西宁热电厂“上大压小”新建工程（原西宁热电厂一期2×300MW级工程）	华能西宁热电有限责任公司	水保函[2012]145号	2015-8-28	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成70%，水土保持工程施工措施完成70%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测和监理。存在水土保持措施实施滞后，临时防护措施不到位，后缘设计不完善等问题。应加快水土保持措施及贮灰场建设进度，加强拦挡、苫盖等临时防护措施。		
3	黄河大河家水电站工程	青海省三江水电开发股份有限公司	水保函[2013]35号	2015-8-29	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成95%，水土保持工程施工措施完成95%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。存在水土保持措施实施滞后，水土保持监测和监理工作不规范等问题。应加快植物措施建设进度；切实规范水土保持监测和监理工作。		
4	中电投西宁2×600MW级火电厂工程	黄河上游水电开发公司	水保函[2013]418号	2015-8-30	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成80%，水土保持工程施工措施完成80%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。应加快贮灰场建设进度，抓紧实施植物措施，做好已剥离表土的利用，加强洒水、苫盖等临时措施，及时清理临时堆土及建筑垃圾，加快施工生产生活区清理整治，尽快依法缴纳水土保持补偿费。		
5	新建格尔木至库尔勒铁路（青海段）	青藏铁路公司格库铁路建设指挥部	水保函[2014]226号	2015-8-26	黄河水利委员会西峰黄土水保持科学试验站	主体工程完成5%水土保持措施尚未实施。未开展水土保持监测和监理。存在取土场水土保持措施实施滞后，施工过程中的临时防护措施不到位等问题。应加强施工管理，杜绝随意占压、堆弃现象，加快取土场水土保持措施实施进度，加强水土保持临时措施，尽快开展水土保持监测和监理工作，及时缴纳水土保持补偿费。		
6	陕甘宁盐环定扬黄续建工程（甘肃段）	庆阳市盐环定扬黄续建工程建设管理局	水保函[2008]496号	2015-8-5	甘肃省水土保持科学研究所	主体工程完成90%，水土保持工程施工措施未实施，局部防护措施水毁等问题。应加强施工管理，严禁随意扰动，抓紧实施支管线植物措施，及时修复加固水毁工程。		
7	750千伏兰州东-天水-宝鸡输变电工程（甘肃段）	国网甘肃省电力公司	水保函[2009]180号	2015-7-28	黄河水利委员会西峰黄土水保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程施工措施完成95%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测和监理。存在山区塔基、道路防治区植物措施不到位，水土保持监测和监理工管理，严禁随意扰动，抓紧实施支管线植物措施，及时修复加固水土保持监测和监理工作，做好水土保持设施验收准备。		
8	甘肃省靖远县双永供水工程	靖远县双永供水工程管理局	水保函[2009]464号	2015-8-4	甘肃省水土保持科学研究所	主体工程完成98%，水土保持工程施工措施完成90%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。存在植物措施不完善、部分弃渣未采取拦挡措施、料场整治不到位等问题。应抓紧实施各防治区植物措施，尽快完成隧洞外弃渣场的拦挡措施及料场整治。		
9	华能甘肃能源开发有限公司核桃峪矿井及选煤厂	华能甘肃能源开发有限公司	水保函[2010]41号	2015-8-7	甘肃省水土保持科学研究所	主体工程完成90%，水土保持工程施工措施完成80%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理。存在排矸场建设滞后、副井工业场地边坡未采取防护措施、临时防护不到位等问题。应加快排矸场建设进度，并及时落实各项防护措施；尽快完成副井工业场地的边坡防护，加强临时防护措施。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况	备注
10	改建铁路包兰线惠农至银川段增建二线工程	兰州铁路局	水保函[2010]123号	2015-7-2	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成97%，植物措施完成91%。开展了水土保持监测。应查漏补缺，完善各项水土保持措施，做好水土保持设施验收准备。	
11	庆阳民用机场扩建工程	甘肃省机场投资管理有限公司	水保函[2010]172号	2015-8-6	甘肃省水土保持科学研究所	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成90%。开展了水土保持监测。存在弃土场防治措施不完善、航站区植物措施进度滞后、场外排水措施不到位、水土保持方案发生变更未履行相关手续等问题。应尽快完善弃土场防治措施，及时实施航站区植物措施和场外排水措施，抓紧履行相关变更手续。	
12	连霍国道主干线兰州南绕城高速公路	甘肃路桥投资有限公司	水保函[2010]178号	2015-8-1	黄河水利委员会天水水土保持科学试验站	主体工程完成20%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测。应加强施工管理，严禁乱堆乱弃；尽快完成全部弃渣场拦挡及排水措施，完善施工工地、施工便道护坡和截排水措施，加强表土剥离等临时防护措施，尽快修建西山岭隧道施工生产生活区至安全区域；抓紧依法缴纳水土保持补偿费。	



弃土场草垫隔离临时防护



表土分区堆放并临时苫盖保护

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
13	新建铁路兰州至中川城际铁路	中川铁路有限公司	水保函 [2011]316号	2015-8-2	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成75%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成15%。开展了水土保持监测和监理。存在部分弃渣场拦挡措施未完善、排水措施未实施，施工道路排水分措施不到位等问题。应加快推进水土保持措施建设进度，尽快完成弃渣场沟弃渣场各项防治措施，完善其他弃渣场拦挡和施工道路排水措施，依法缴纳水土保持补偿费。		
14	甘肃省引洮供水一期会宁北部供水工程	甘肃省会宁引洮供水水管局	水保函 [2011]328号	2015-8-3	广东粤源水利水电工程咨询有限公司	主体工程完成56%，水土保持工程措施完成55%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。存在水土保持后续设计未开展，部分弃渣场拦挡、植物措施建设滞后，临时弃土未采取苫盖措施，水土保持监测和监理工作不规范等问题。应全面整改。		
15	兰州至海口高速公路（G75）渭源至武都段工程	甘肃长达路业有限责任公司	水保函 [2012]208号	2015-7-29		正在进行试验段施工。应做好水土保持后续设计，彻底清理隧道入口外河道弃渣，尽快完成隧道入口外河道改造及隧道出口外弃渣场排水措施，做好弃渣场及其他防治区的边坡整治，加强水土保持临时措施，及时开展水土保持监测和监理工作。		
16	中国石油长庆油田鄂尔多斯盆地甘肃陕西境内华庆油田油气开发工程（甘肃境内）	中国石油长庆油田分公司	水保函 [2012]235号	2015-7-21	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理。		2015年8月10日水土保持设施通过验收。
17	新建兰州至合作铁路	兰州铁路局	水保函 [2014]279号	2015-7-31		主体工程刚开工。应抓紧做好水土保持工程后续设计，尽快落实隧道出口外施工场地、拌合站的边坡防护和排水措施，完成弃土场拦挡及排水设施，及时开展水土保持监测和监理工作，依法缴纳水土保持补偿费。		
18	世行贷款节水灌溉二期项目(宁夏项目区)	宁夏回族自治区水利厅	水井保 [2011]130号	2015-7-2		主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成90%。未开展水土保持监测。应查漏补缺，完善各项水土保持措施，做好水土保持设施验收准备。		
19	宁夏青铜矿区韦二煤矿	宁夏庆华煤化集团有限公司	水保函 [2012]3号	2015-7-1	宁夏回族自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测，尽快实施排矸场拦挡及渣体边坡整治等措施，规范排矸工艺，做好水土保持设施验收准备。		
20	中电投宁夏中卫热电厂2×350MW工程	中电投宁夏能源铝业中卫热电有限公司	水保函 [2012]70号	2015-6-30	北京北林丽景生态环境规划设计有限公司	主体工程完成75%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。存在植物措施建设滞后、临时措施不到位、贮灰场位置变更未履行变更手续等问题。应加快推进植物措施建设进度，加强临时防护措施，尽快履行贮灰场变更手续。		
21	宁夏银川河东机场三期扩建工程	西部机场集团宁夏机场分公司	水保函 [2012]237号	2015-6-18	黄河水利委员会西峰黄土保持科学试验站	主体工程完成35%，水土保持工程措施完成35%，植物措施完成1%。开展了水土保持监测和监理。存在植物措施建设滞后，水土保持临时防护措施不到位等问题。应加快水土保持措施实施进度，抓紧开展取土场整治，加强洒水、苫盖及拦挡等临时防护措施。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

18

2 编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
22	宁夏清水河防洪治理工程	宁夏水利工程建设中心	水保函[2012]401号	2015-6-30	宁夏清溪水土保持技术服务中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成20%。开展了水土保持设计、监测和监理。应加快水土保持植物措施，完善相关变更手续。		
23	神华宁夏煤业集团有限公司双马一矿井及选煤厂	神华宁夏煤业集团有限责任公司	水保函[2013]290号	2015-6-16	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成83%。开展了水土保持监测。存在排矸场建设进度缓慢、厂区部分裸露地未绿化等问题。应加快排矸场建设进度，尽快实施各项水土保持措施，及时对厂区裸露地面进行绿化，做好水土保持设施验收准备。		
24	沙湖750kV输变电工程	宁夏回族自治区电力公司	水保函[2013]309号	2015-7-2	中国水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测。存在部分塔基植物措施未实施，水土保持监测和监理工作不到位等问题。应完善各防治区植物措施；切实规范水土保持监测和监理工作；做好水土保持设施验收准备。		
25	中国石化长城能源化工（宁夏）煤业有限公司银星二号煤矿（原国电英力特能源化工集团股份有限公司银星二号煤矿含选煤厂）	中石化长城能源化工（宁夏）煤业有限公司（原中铝宁夏能源有限公司）	水保函[2013]395号	2015-6-16	黄河水利委员会西峰黄河水土保持科学试验站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。上年度督查意见落实不到位。应强化水土保持法律意识，重视水土保持工作；加强施工管理，杜绝乱堆乱弃；加快水土保持措施实施进度，尽快实施排矸场拦挡措施、道路防治区土地整治、工业场地边坡防护及植物措施，加强苫盖、洒水等临时防治措施。		
26	中铝宁夏银星电厂一期2×660MW工程机组工程	宁夏银星发电有限公司（原中铝宁夏能源有限公司）	水保函[2014]394号	2015-6-17	北京华夏山川生态环境科技有限公司	正在开展“四通一平”。开展了水土保持施工范围，严禁随意扰动，继续加强各项水土保持临时防护措施。		
27	宁夏枣灵电厂一期2×660MW超超临界机组工程	宁夏枣灵发电有限公司	水保函[2014]412号	2015-6-17	北京华夏山川生态环境科技有限公司	正在开展“四通一平”。应尽快开展水土保持后继设计；加强施工管理，优化施工工艺，严格控制施工范围，严禁随意扰动；加强洒水、苫盖及拦挡等水土保持临时防护措施；尽快开展水土保持监测和监理工作。		
28	宁夏大坝发电厂四期工程	宁夏大坝发电有限公司	水保函[2014]416号	2015-7-1	北京华夏山川生态环境科技有限公司	完成“四通一平”，目前项目停工。开展了水土保持监测和监理。应加强施工管理，停工		
29	神华国华宁东发电厂2×660MW扩建工程	宁夏国华宁东发电有限公司	水保函[2014]418号	2015-6-17	北京华夏山川生态环境科技有限公司	完成“四通一平”。应尽快开展水土保持后继设计；加强施工管理，严格控制施工范围，严禁随意扰动；尽快完成厂区围墙外水土保持防护措施；及时履行相关变更手续；尽快开展水土保持监测和监理工作。		
30	国电宁夏方家庄电厂2×1000MW机组工程	中国国电集团公司宁夏分公司	水保函[2014]450号	2015-6-17		正在开展“四通一平”。应做好水土保持后继设计；加强施工管理，对扰动区域尽快进行开平，杜绝乱堆乱弃、乱占乱压；加强洒水、苫盖、排水等临时防护措施及表土剥离措施；及时开展水土保持监测和监理工作。		

黄河流域（片）大型生产建设项目建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
31	华能魏家峁煤电一体化一期工程（电厂4×600MW机组）	北方魏家峁煤电有限责任公司	水保函[2005]325号	2015-7-9	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成55%，植物措施完成50%。开展了水土保持监测和监理。存在二期预留地裸露区域及厂区临时堆土临时防护措施不完善等问题，应抓紧整改，加强拦挡、苫盖等水土保持临时防护措施。		
32	内蒙古珠江投资有限公司青山塔煤矿及选煤厂工程	内蒙古珠江投资有限公司	水保函[2006]64号 办水保函[2015]463号	2015-7-10	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。应加快水土保持措施建设进度，加强铁路专用线弃土（渣）场整治力度，落实拦挡、苫盖等临时防护措施；加强施工管理，严禁乱挖、乱倒、乱弃。		
33	新建铁路朔州至准格尔铁路工程	准朔铁路有限责任公司	水保函[2006]145号	2015-8-21	水利部水土保持植物 开发管理中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成75%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。存在历年水土保持督查意见基本未落实，随意弃土弃渣，施工场乱挖、乱堆、乱弃且未采取临时防护措施，水土保持监测和监理工作不到位，未足额缴纳水土保持补偿费等问题。应全面整改。		
34	内蒙古塔然高勒矿区红庆梁矿井及选煤厂	杭锦旗西部能源开发有限公司	水保函[2006]370号 水保函[2014]256号	2015-8-17	内蒙古自治区水土保 持监测站	主体工程完成55%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。应做好水土保持后续设计；加快工业场地截排水设施，及时实施风井场地北侧、东侧水土保持措施；加强施工管理，杜绝乱堆乱弃。		
35	新建铁路塔本陶勒盖矿区配套铁路运煤专用线甘其毛道至万水泉南段（甘泉线）	神华甘泉铁路有限责任公司	水保函[2006]467号	2015-8-10	北京华夏山川生态环 境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。应加快水土保持措施建设进度，完善取、弃土（渣）场的防治措施，及时履行相关变更手续；切实加强施工管理，杜绝乱堆乱弃。		
36	内蒙古银宏能源开发有限公司泊江海子矿井及选煤厂	内蒙古银宏能源开发有限公司	水保函[2006]566号 办水保函[2014]515号	2015-7-14	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成75%。应完善风井场地及工业场地裸露地水土保持措施，及时实施临时周转排矸场分阶、覆土、植草等防治措施，落实拦挡、苫盖等临时防护措施；加强施工管理，杜绝乱堆乱弃；切实规范水土保持监测和监理工作。		
37	鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟矿井及选煤厂	鄂尔多斯市国源矿业开发有限公司	水保函[2007]275号	2015-7-11		主体工程完成10%，水土保持工程措施完成5%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测。应抓紧开展水土保持监测工作；加快水土保持措施实施进度，落实水土保持临时防护措施，尽快实施排矸场拦挡措施，清理整治施工迹地；履行相关变更手续。		
38	杭锦煤矸石发电厂2×300MW机组工程	内蒙古能源发电杭锦发电有限公司	水保函[2007]289号	2015-8-9	中国水利水电科学研 究院	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。应加快植物措施实施进度，尽快实施贮灰场截排水措施，完善厂外弃土的拦挡、苫盖等临时防护措施；切实规范水土保持监测和监理工作。		
39	内蒙古汇能煤化工有限公司年产16亿立立方米煤制天然气项目	内蒙古汇能煤化工有限公司	水保函[2008]170号 办水保函[2015]108号	2015-6-11	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测。应尽快开展厂外一号蓄水池水土保持后续设计，并付诸实施；尽快整治蓄水池开挖产生的弃土（渣）；依法缴纳水土保持补偿费。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
40	京包线集宁至包头段 增建第二双线工程	蒙冀铁路有限公司	水保函 [2008]175号	2015-5-27	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监 测和监理。		2015年6月 23日水土保 持设施通过 验收。
41	内蒙古蒙泰不连沟煤 业有限责任公司大路 2×300MW坑口煤矿 石热电厂	内蒙古自治区大路 煤业有限责任公司	水保函 [2009]19号	2015-7-8	北京北林丽景生态环 境规划设计院有限公 司	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成45%。开展了水土 保持监测和监理。应加快水土保持措施实施进度，落实拦挡、苫盖等临时防护措施； 加强施工管理，严禁随意扰动；尽快履行相关变更更手续。		
42	黄河海勃湾水利枢 纽工程	黄河海勃湾水利枢 纽工程建设管理局	水保 [2009]145号	2015-8-5	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成90%。开展了水土 保持监测。应尽快清理施工现场建筑垃圾，抓紧实施大坝左岸网围栏及防护林带等措 施，做好水土保持设施验收准备。		
43	新建铁路大塔至马场 壕线	鄂尔多斯沿河铁路 有限责任公司	水保函 [2009]266号	2015-8-18	内蒙古自治区水土保 持监测站	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成80%。开展了水土 保持监测。应进一步加强取土场水土保持植物措施，尽快清理整治施工场地，做好水 土保持设施验收准备。		
44	新建铁路大塔至四眼 井线吴四圪堵至四眼 井段	鄂尔多斯沿河铁路 有限责任公司	水保函 [2009]268号	2015-8-18	内蒙古自治区水土保 持监测站	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成85%。开展了水土 保持监测。应进一步加强取土场植物措施，尽快清理整治施工场地及施工便道，及时 履行取土场变更更手续，做好水土保持设施验收准备。		
45	国家高速公路网荣成 至乌海高速公路十七 沟至大饭铺段	鄂尔多斯市交通运 输局	水保函 [2009]377号	2015-7-7	内蒙古自治区水土保 持工作站	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成80%。开展了水土 保持监测和监理。应加快各项水土保持措施实施进度，尽快对弃土弃渣场进行彻底整 治，及时履行取、弃土场相关变更更手续；切实规范水土保持监测和监理工作。		
46	新建铁路大准至朔黄 铁路联络线工程（内 蒙古段）	神华准池铁路有限 责任公司	水保函 [2009]395号	2015-8-11	北京北林丽景生态环 境规划设计院有限公 司	主体工程完成99%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成25%。开展了水土 保持监测。应加快植物措施建设进度；对全线弃渣场进行排查，查缺补漏，完善各项 防护措施；加强施工迹地整治；切实规范水土保持监测和监理工作。		
47	鄂尔多斯市华兴能源 有限责任公司唐家会 煤矿（6.0Mt/a）工程	鄂尔多斯市华兴能 源有限责任公司	水保函 [2010]45号 办水保函 [2015]241号	2015-7-8	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成65%。开展了水土 保持监测和监理。应加快水土保持措施实施进度，尽快实施临时周转排矸场、弃渣场 拦挡、截排水等水土保持措施，完善临时防护措施，清理整治零星弃土（渣）；加强 施工管理，严禁乱挖、乱倒、乱弃。		
48	长庆气田一呼和浩特 天然气输气管道复线 工程	内蒙古西部天然气 股份有限公司	水保函 [2010]50号	2015-8-12	内蒙古自治区水土保 持工作站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成90%。开展了水土保 持监测。应全线排查，查漏补缺，抓紧落实未实施的防护措施，及时进行补植补栽， 完善水土保护工程的排水措施；切实规范水土保持监测和监理工作。		

黄河流域（片）大型生产建设项目建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况	备 注
49	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司连一号矿井及选煤厂	内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司	水保函[2010]142号	2015-6-16	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程完成85%，水土保持措施完成60%，植物措施完成40%。开展了水土保持监测和监理。应加快植物措施建设进度，完善水土保持临时防护措施，尽快清理整治工业场地北侧临时堆土。	2015年11月19日水土保持设施通过验收。
50	内蒙古康巴什热电厂2×300MW级空冷机组工程	内蒙古京能康巴什热电有限公司	水保函[2010]351号	2015-6-12	中国水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测。存在局部裸露区域植物措施不完善、未缴纳水土保持补偿费等问题。应完善各项水土保持措施，依法缴纳水土保持补偿费，做好水土保持设施验收准备。	2015年11月19日水土保持设施通过验收。
51	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司母杜柴登矿井及选煤厂	鄂尔多斯市伊化矿业资源有限责任公司	水保函[2011]11号	2015-8-8	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成45%。开展了水土保持监测和监理。应加强施工管理，落实各项水土保持措施；加快场区北侧水土保持措施实施进度；尽快履行弃土场相关变更手续；做好水土保持设施验收准备。	
52	新建铁路东乌至包西联络线	呼准鄂铁路有限责任公司（原呼和浩特铁路局包西东乌联络线建设指挥部）	水保函[2011]36号	2015-6-12	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成30%。开展了水土保持监测和监理。应抓紧实施各项水土保持措施，尽快开展取土场相关变更手续。	
53	新建铁路陶利庙至鄂托克前旗线	鄂尔多斯南部铁路有限公司	水保函[2011]37号	2015-8-8		主体工程完成70%，水土保持工程措施完成5%，植物措施未实施。未开展水土保持监测和监理。应做好水土保持后续设计，加快水土保持措施建设进度，完善取土场各项防治措施，落实苫盖、拦挡等临时措施；加强施工管理，严格控制施工范围，减少扰动；尽快开展水土保持监测和监理工作。	
54	新建铁路巴准线巴图塔至点岱沟工程	神华新准铁路有限责任公司	水保函[2011]118号	2015-7-13	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测。应尽快完善部分弃土（渣）场各项水土保持措施，清理整治施工生活区、施工便道等，做好水土保持设施验收准备。	
55	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司马泰壕煤矿项目	内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司	水保函[2011]287号	2015-6-9	中国水利水电科学研究院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成85%，目前项目停工。应落实苫盖等水土保持临时防护措施，加强对已建水土保持设施的管理与维护。	停工



弃渣场分级平整及植被恢复

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
56	新建铁路呼和浩特至准格尔	呼准鄂铁路有限责任公司	水保函[2011]324号	2015-9-24	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成65%，水土保持工程措施完成65%，植物措施完成20%。开展了水土保持监测和监理。应加快水土保持措施实施进度，抓紧实施取土场、弃渣场的各项水土保持措施，及时对桥梁、施工便道进行整治；加强施工管理，严格控制施工作业范围，杜绝随意扰动；尽快完善取土场、弃渣场变更手续；依法缴纳水土保持补偿费。		
57	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司色连二号矿井及选煤厂	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	水保函[2012]215号	2015-6-16	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成60%。存在植物措施实施滞后、排矸场变更未履行相关手续等问题。应加快植物措施实施进度，完善各项工作水土保持工程措施，履行排矸场变更手续，做好水土保持设施验收准备。		
58	大牛地气田（大8、大10、大65井区）天然气产能建设工程（内蒙古境内）	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函[2012]371号	2015-6-10	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测。应加快植物措施实施进度，完善水土保持临时防护措施，尽快履行水土保持措施变更相关手续。		
59	荣成至乌海高速公路棋盘井至乌海段工程	乌海市交通管理局	水保函[2012]397号	2015-8-7	黄河水域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成20%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测和监理。应做好水土保持工程后纂设计，加强施工管理，杜绝乱堆乱弃；加强拦挡、苫盖等临时防护措施和表土剥离措施；尽快履行取土场相关变更手续。		
60	内蒙古大唐托克托电厂五期扩建项目	内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司	水保函[2013]156号	2015-8-22	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成10%，水土保持工程措施完成5%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测和监理。应完善各防治区水土保持措施，加强施工管理，减少施工扰动，落实水土保持临时防护措施。		
61	包头钢铁（集团）有限责任公司“十二五”结构调整稀土钢总体发展规划项目	包头钢铁（集团）有限责任公司	水保函[2013]193号	2015-8-9	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成99%，植物措施完成99%。开展了水土保持监测。应加强对已建水土保持设施的管护，完善各项防护措施，做好水土保持设施验收准备。		
62	神华乌海能源有限责任公司乌素煤矿三号井（运行期）	神华乌海能源有限责任公司	水保函[2013]310号	2015-8-6	内蒙古自治区水土保持工作站	属运行期项目，水土保持工程措施完成25%，植物措施完成15%。开展了水土保持监测和监理。存在水土保持措施实施进度严重滞后、厂区外乱堆乱弃等问题。应强化水土保持法律意识，进一步重视水土保持工作，采取有力措施，及时落实水土流失防治措施，抓紧清理厂区外乱堆乱弃的渣土。		
63	神华乌海能源有限责任公司平沟煤矿（运行期）	神华乌海能源有限责任公司	水保函[2013]312号	2015-8-6	内蒙古自治区水土保持工作站	属运行期项目，水土保持工程措施完成25%，植物措施完成15%。开展了水土保持监测和监理。存在风井场植物措施未实施、排矸场拦挡等措施不完善等问题。应强化水土保持法律意识，进一步重视水土保持工作，采取有力措施，及时落实风井场植物措施建设进度，完善排矸场拦挡措施。		
64	神华乌海能源有限责任公司黄白茨煤矿（运行期）	神华乌海能源有限责任公司	水保函[2013]313号	2015-8-6	内蒙古自治区水土保持工作站	属运行期项目，水土保持工程措施完成25%，植物措施完成15%。开展了水土保持监测和监理。存在排矸场未设置拦挡设施，厂区门前弃土弃渣未清理等问题。应强化水土保持法律意识，进一步重视水土保持工作，采取有力措施，及时落实水土流失防治措施，抓紧实施排矸场拦挡设施；尽快清理厂区门前弃土弃渣。		

黄河流域（片）大型生产建设项目建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
65	神华乌海能源有限责任公司五虎山煤矿(运行期)	神华乌海能源有限公司	水保函[2013]314号	2015-8-6	内蒙古自治区水土保持工作站	属运行期项目，水土保持工程措施完成25%，植物措施完成15%。开展了水土保持监测和监理。存在排矸场未设置拦挡设施，且未采取任何防治措施，厂区外乱堆弃土等问题。应强化水土保持法律意识，进一步重视水土保持工作，采取有力措施，及时落实水土流失防治措施，尽快建设排矸场拦挡设施，及时清理厂区外弃土弃渣。		
66	石拉乌素矿井及选煤厂工程	内蒙古昊盛煤业有限公司	水保函[2014]46号	2015-6-9	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成30%，植物措施实施进度，完善临时防护措施，及时实施排矸场拦挡等防护措施；加强施工管理，严禁乱堆乱弃。		
67	内蒙古自治区东胜区转龙湾矿区东矿	鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司	水保函[2014]87号	2015-6-11	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成15%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。应做好水土保持措施及排矸场建设，完善拦挡、苫盖等临时防护措施，尽快清理工业场地、风井场地临时堆矸，依法缴纳水土保持补偿费。		
68	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司塔拉壕矿井及选煤厂工程	内蒙古伊泰煤炭股份有限公司	水保函[2014]380号	2015-6-15	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成75%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成65%。开展了水土保持监测和监理。应尽快实施工业场地周边高陡边坡防治措施，及时完善厂区内地露区域防治措施，落实拦挡、苫盖等临时防护措施，加快拦矸坝建设进度。		
69	新建铁路马场壕至何家塔线	鄂尔多斯沿河铁路有限责任公司	水保函[2015]395号	2015-8-19	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成80%，植物措施实施进度65%。开展了水土保持监测。应落实新开工路段拦挡、苫盖等水土保持临时防护措施，尽快清理整治施工场地。	原水保函[2009]195号作废。	
70	陕西彬长矿区开发建设有限公司小庄矿井建设工程	陕西彬长矿业集团有限公司	水保函[2005]422号	2015-8-6	陕西省水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测。存在风井场地植物措施建设滞后，土地整治不到位，排矸场排矸工艺不规范，防治措施进度滞后等问题。应尽快完成风井场地土地整治和植被建设工程；规范排矸工艺，抓紧实施排矸场截排水、开级削坡等措施；做好水土保持设施验收准备。		
71	新建铁路西安至平凉线(陕西段)	西平铁路有限责任公司	水保函[2007]359号	2015-8-5	陕西省水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测。存在部分取土场、弃渣场防治措施滞后，取、弃土（渣）场变更手续不完善等问题。应尽快完成相关取土场、弃渣场截排水、土地整治、植被恢复等防治措施，完善弃土场、弃渣场等变更手续，做好水土保持设施验收准备。		
72	陕西省榆林矿区神木香水河矿井及选煤厂	神木县香水河矿业有限公司	水保函[2009]127号	2015-6-29	陕西省水土保持生态环境监测中心	主体工程完成25%，水土保持工程措施完成10%，植物措施完成10%，目前项目停工。开展了水土保持监测和监理。应做好水土保持后续设计；工程复工后，抓紧实施各项水土保持措施，及时清理整治榆神铁路南侧堆矸及工业场地零星弃土弃渣，完善临时截排水措施；加强施工管理，杜绝乱堆乱弃；切实规范水土保持监测和监理工作。	停工	
73	瓮矿榆林100万t/a煤间接液化制油工业示范项目	陕西未来能源化工有限公司	水保函[2009]199号	2015-7-2	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成50%。开展了水土保持监测和监理。应加快植物措施实施进度，加强拦挡、苫盖等临时防护措施，完善厂外道路水土保持措施。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
74	陕西未来能源化工有限公司金鸡滩煤矿（原兖州煤业榆林能化有限公司金鸡滩矿井建设项目）	陕西未来能源化工有限公司	水保函[2009]205号	2015-7-9	中国科学院水利部水土保持研究所	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测。基本未落实上年度督查意见。水土保持工程措施不到位，植物措施滞后，水土保持方案变更未履行相关手续。应尽快完善各项水土保持措施，清理整治厂区内的矸石（渣），履行相关变更手续。		
75	新建铁路西安至成都客运专线西安至江油段（陕西段）	西成铁路客运专线陕西有限责任公司	水保函[2010]169号	2015-8-6	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成65%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。应完善弃渣场拦挡措施，并及时整治、恢复植被；落实拦挡、苫盖等临时防护措施；加强施工管理，杜绝随意堆弃；尽快清理河（沟）道弃渣。		
76	榆林神华能源有限责任公司青龙寺矿及选煤厂	榆林神华能源有限责任公司	水保函[2010]373号	2015-6-25	黄河水利委员会天水水土保持科学试验站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测。存在选煤厂高陡边坡防护措施不到位、厂区、排矸场植物措施不完善、排矸道路边坡防护措施不到位等问题。应完善选煤厂高陡边坡防护及厂区、排矸场植物措施，加强排矸道路边坡防护措施。		
77	榆林神华能源有限责任公司郭家湾煤矿及选煤厂	榆林神华能源有限责任公司	水保函[2010]374号	2015-6-25	陕西省水利电力勘测设计研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测。应加快临时风井场植物措施建设进度，完善排矸场防护措施，清理运矸道路零星弃矸，做好水土保持设施验收准备。		



煤矿工业厂区绿化美化



渠道两侧植被恢复

黄河流域（片）大型生产建设项目建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						主体工程完成98%，水土保持工程措施完成92%，植物措施完成85%。开展了水土保持监测。存在排矸场防治措施滞后，进场道路、排矸道路、工业场区、风井场植物措施不完善等问题。应尽快实施排矸场拦挡、护坡等防护措施，加快植物措施进度，做好水土保持设施验收准备。	主体工程完成10%，水土保持工程措施完成5%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测和监理。应加快排土场水土保持设施建设；加强施工工艺，优化施工管理，优化施工工艺，减少扰动；落实拦挡、苫盖等临时防护措施。	
78	陕西华电榆横煤电有限责任公司小纪汗矿井及选煤厂工程	陕西华电榆横煤电有限责任公司	水保函[2011]124号	2015-7-2	黄河流域水土保持生态环境监测中心			
79	陕西神延煤炭有限责任公司榆神矿区西湾露天煤矿	陕西神延煤炭有限责任公司	水保函[2011]307号	2015-6-29	黄河水文水资源科学研究院			
80	陕西省府谷清水川煤电一体化二期2×100万千瓦扩建项目	陕西清水川能源股份有限公司（原陕西清水川发电有限公司）	水保函[2012]158号	2015-6-26	陕西省水利电力勘测设计研究院			
81	陕西延长石油集团横山魏墙矿业有限公司	陕西延长石油集团横山魏墙矿业有限公司及选煤厂	水保函[2013]389号	2015-7-3	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站			
82	陕西省澄合矿区山阳煤矿	澄合矿务局	水保函[2013]390号	2015-8-4	陕西省水土保持生态环境监测中心			
83	华能榆神榆林热电联产新建工程	华能榆神热电有限公司	水保函[2014]195号	2015-7-9	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站			
84	陕北榆神矿区小保当一号煤矿规划区小保当矿业有限公司	陕西小保当矿业有限公司	水保函[2014]272号	2015-6-29	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站			
85	山西汾西矿业集团公司新阳矿井改扩建及配套选煤厂工程	山西汾西矿业集团公司	水保函[2007]133号	2015-6-14	山西省水土保持科学研究所			
86	山西王家岭煤业有限公司王家岭矿井及选煤厂	山西王家岭煤业有限公司	水保函[2007]239号	2015-6-13	北京北林丽景生态环境规划设计有限公司			

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
87	交口肥美铝业有限责 任公司 80万t/a氧化 铝工程	山东信发集团	水保函 [2007]253号 办水保函 [2013]517号	2015-6-15	北京北林丽景生态环 境规划设计院有限公 司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 90%，植物措施完成 85%。开展了水土保 持监测。未落实上年度督查意见。应提高水土保持法律意识，重视水土保持工作；加 快赤泥库道路高陡边坡整治及截排水设施建设，加快植物措施建设进度，切实规范水 土保持监测和监理工作；做好水土保持设施验收准备。		
88	中国铝业兴县氧化铝 项目	山西华兴铝业有限 公司	水保函 [2008]42号	2015-6-12	水利部水土保持植物 开发管理中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 90%。开展了水土保 持监测。存在输泥输送水管线、赤泥库道路沿线随意弃土（渣），主工业场区植物措施施 实施不到位等问题。应清理整治渣场拦挡、截排水、削坡 主工业厂区植物措施，做好水土保持设施验收准备。		
89	国家高速公路网青 岛～兰州公路山西境 临汾～吉县（壶口）段 工程	山西省临吉高速公 路建设管理处	水保函 [2008]149号	2015-6-5	北京华夏山川生态环 境科技有限公司	主体工程已经完工，水土保持工程措施完成 85%，植物措施完成 75%。开展了水土 保持监测。应尽快清理河道内弃渣，按设计要求及时实施弃渣场拦挡、截排水、削坡 升级、渣面平整、植被恢复等措施；尽快履行相关变更手续；切实规范水土保持监测 和监理工作。		
90	山西省中阳荣欣焦化 有限公司高家庄煤矿 工程	山西省中阳荣欣焦化 有限公司	水保函 [2008]174号	2015-5-27	黄河水利委员会绥德 水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监 测和监理。		2015年6月 23日水土保 持设施通过 验收。
91	改建铁路南同蒲线榆 能改造工程	太原铁路局南同蒲 线扩能改造指挥部	水保函 [2008]274号	2015-6-13	黄河水利委员会绥德 水土保持科学试验站	主体工程已试运行多年，水土保持设施一直未验收。应全线排查，查漏补缺，完善各 项防治措施，抓紧申请水土保持设施验收。		
92	神华河曲 2×300MW (CFB)发电工程	神华神东电力山西 河曲发电有限公司	水保函 [2008]311号	2015-6-14	黄河水利委员会绥德 水土保持科学试验站	主体工程完成 70%，水土保持工程措施完成 60%，植物措施完成 40%。开展了水土 保持监测和监理。应做好水土保持后续设计，加快水土保持设施临时措施。		
93	侯马电厂 2×300MW 热电联产扩建工程	山西漳泽电力股份 有限公司侯马热电 分公司	水保函 [2009]3号	2015-6-4	中国科学院水利部水 土保持研究所	主体工程完成 95%，水土保持工程措施完成 95%，植物措施完成 95%。开展了水土 保持监测。存在施工生产生活区部分临时设施未拆除，水土保持措施变更未履行相关 手续等问题。应及时拆除施工生产生活区临时设施，尽快履行水土保持措施变更手续， 做好水土保持设施验收准备。		
94	山西锦兴能源有限公 司兴县肖家洼煤矿	山西锦兴能源有限 公司	水保函 [2010]99号	2015-6-11	山西省水土保持监测 中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成 80%，植物措施完成 60%。开展了水土保 持监测。基本未落实上年度督查意见。应提高水土保持法律意识，重视水土保持工作， 彻底清理进场道路两侧矸石，整治风井场、运煤道路零星弃土（渣），完善截排水设施， 加快植物措施建设进度，完善排矸场各项水土保持措施，规范排矸工艺；切实规范水 土保持监测和监理工作。		
95	山西高平源野煤业有 限公司沟底煤矿建设 工程	山西高平源野煤业 有限公司	水保函 [2010]127号	2015-6-3		主体工程完成 10%，水土保持工程措施完成 5%，植物措施未开展。目前项目停工。 应做好水土保持工程后续设计，完善苫盖、临时排水等水土保持防护措施，尽快开展 水土保持监测和监理工作；工程复工后做好高陡边坡的防护措施，完善边坡及进场道 路两侧排水。	停工	

黄河流域（片）大型生产建设项目建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复工号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
96	国投晋能能源有限公司里必矿井及选煤厂	国投晋能能源有限公司	水保函[2011]13号	2015-6-2		主体工程完成了“四通一平”。应做好水土保持后续设计；加强施工管理，优化施工工艺，尽量减少扰动；掘进矸石应合场平工程综合利用；及时清理场区内临时堆土；尽快开展水土保持监测和监理工作。		
97	山西省临汾机场复航改造工程	山西临汾民航机场筹建处	水保函[2011]44号	2015-6-4	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程完成95%，水土保持工程措施实施完成95%，植物措施实施完成90%。开展了水土保持监测。应加快植物措施实施进度，加强洒水、苫盖等临时防护措施；及时履行相关变更手续；切实规范水土保持监测和监理工作；做好水土保持设施验收准备。		2015年11月13日水土保持设施通过验收。
98	新建吕梁至临县（孟门）铁路支线	吕临铁路公司	水保函[2011]84号	2015-9-23	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施实施完成75%，植物措施基本处于停滞状态。应加快植物被恢复，完善弃渣场变更手续。		
99	中国铝业兴县氧化铝黄浑头矿山工程	山西华兴铝业有限公司	水保函[2011]283号	2015-6-12	黄河流域水土保持生态环监监测中心	主体工程完成85%，水土保持工程措施实施完成50%，植物措施完成35%。开展了水土保持监测。上年度督查意见落实不到位。应提高水土保持法律意识，重视水土保持工作；加快水土保持措施实施进度，及时实施排渣场栏挡及截排水措施，落实高陡边坡防护措施，抓紧对临时堆放的周转材料（石）采取挡、苫盖等临时措施。		
100	平鲁虎头山风电场（250MW）大功率风电机组示范工程	国电朔州海丰风力发电有限责任公司	水保函[2011]373号	2015-6-12		主体工程完成30%，水土保持工程措施实施完成20%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测。应做好水土保持后续设计，加强施工管理，严格控制施工范围，杜绝乱堆乱弃；尽快完成生产道路两侧及塔基周边弃土弃渣清理整治、边坡防护及排水设施建设；做好表土剥离和保护工作；及时实施风机区栏挡、苫盖等临时措施；尽快开展水土保持监测和监理工作。		
101	山西吕梁兴县500kV输变电工程	国家电网公司山西电力公司	水保函[2012]128号	2015-6-16	山西省水土保持监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成90%。开展了水土保持监测。应完善基及施工区土地整治，及时实施各项水土保持措施，完善施工道路截排水措施，做好水土保持设施验收准备。		2015年9月21日水土保持设施通过验收。
102	静乐县康家会镇15万千瓦风力发电项目	山西龙源风力发电有限公司	水保函[2012]144号	2015-6-13	水利部水土保持植物开发管理中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施实施完成40%，植物措施完成30%，开展了水土保持监测。上年度督查意见未落实。应提高水土保持法律意识，重视水土保持工作；认真落实水土保持“三同时”制度，做好水土保持后续设计，尽快完成全部防治任务；加强施工管理，杜绝乱堆乱弃。		
103	大唐山西新能源有限公司闻喜县后宫乡10万千瓦风力发电项目	大唐山西新能源有限公司	水保函[2013]98号	2015-6-1		主体工程完成10%，水土保持措施尚未实施。未开展水土保持监测和监理。应增强水土保持法律意识，重视水土保持工作；尽快完成水土保持后续设计；清理进场道路西侧和风机及箱变区弃土弃渣，完善排水、沟道顺接及高陡边坡防护等措施；加强施工管理，严格控制作业范围，严禁随意弃土弃渣；尽快开展水土保持监测和监理工作，依法缴纳水土保持补偿费。		
104	山西沁水盆地煤层气郑庄区块9×108m ³ /a产能地面工程	中石油天然气山西煤层气开发分公司	水保函[2013]215号	2015-6-2	黄河河流域水土保持生态环监监测中心	主体工程完成80%，水土保持工程措施实施完成80%，植物措施完成75%，开展了水土保持监测和监理。存在集气站周围边坡防治措施、进场道路两侧排水设施不完善等问题，应抓紧整改，并及时清理零星垃圾和临时堆土。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						主体工程完成15%，水土保持工程措施完成5%，植物措施完成2%，开展了水土保持监测和监理。存在未开展水土保持后续设计、表土剥离不规范等问题。应尽快开展水土保持工程措施，加强表土剥离及保护等水土保持措施。	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成30%，植物措施实施进度，完善临时保持监测和监理。应做好水土保持后续设计，加快水土保持措施实施进度，完善临时防护措施，尽快开展水土保持监测和监理措施，依法缴纳水土保持补偿费。	
105	山西临县霍州煤电低热值煤发电新建项目	山西京能发电有限公司	水保函[2013]384号	2015-6-16	北京华夏山川生态环境科技有限公司			
106	山西国金电力有限公司1×350MW低热值煤发电项目扩建(二期)工程	山西国金电力有限公司	水保函[2014]323号	2015-6-14	山西省水土保持监测中心			
107	华电锦兴兴县2×35万千瓦低热值煤发电项目	山西锦兴能源有限公司	水保函[2014]368号	2015-6-11		正在开展“四通一平”。未开展水土保持监测和监理。应做好水土保持后续设计；清理整治进场道路、施工现场弃土弃渣，落实各项水土保持措施，完善水土保持临时防护措施；尽快开展水土保持监测和监理工作。		
108	塔里木河流域近期综合治理项目开都河第二分水枢纽及两岸干渠工程	塔里木河流域管理局	水保函[2008]605号	2015-10-11	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测。应查漏补缺，完善各项水土保持措施，及时清理零星弃土弃渣，尽快履行弃渣场等相变更手续，做好水土保持设施验收准备。		
109	新疆和丰发电厂一期(2×150MW)工程	国网能源和丰煤电有限公司	水保函[2009]123号	2015-10-12	黄河水利委员会西峰水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成80%。开展了水土保持监测。应及时清理厂区外零星弃土弃渣，完善各防治区水土流失防治措施，尽快履行相关变更手续。		
110	新疆天池能源有限责任公司准东煤田吉木萨尔县南露天煤矿(帐篷沟)一期工程	新疆天池能源有限责任公司	水保函[2010]202号 办水保函[2015]1697号	2015-10-9	新疆水利水电科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程和植物措施基本完成。开展了水土保持监测。应全面排查，查漏补缺，完善植物措施，进一步加强施工管理，对排场进行整治，及时修复损毁的排场围堰，做好水土保持设施验收准备。		
111	神华新疆能源有限责任公司准东煤田五彩湾矿区三号露天煤矿工程	神华新疆能源有限责任公司	水保函[2010]262号	2015-10-9	北京北林丽景生态环境规划设计院有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成90%。开展了水土保持监测。应加强施工管理，杜绝随意堆弃；尽快清理整治堆弃的渣土，完善工业场地植物措施，加快排场边坡整治；完善相关变更手续；切实规范水土保持监测和监理工作。		
112	哈密鲁能煤电化开发有限公司新疆哈密大南湖矿区一号(1000万吨/年)矿井项目	国网能源哈密煤电有限公司	水保函[2010]423号	2015-9-18	水利部水土保持监测中心	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测。存在植物措施建设滞后等问题。应查漏补缺，完善各项水土保持措施，加快植物措施实施进度，做好水土保持设施验收准备。		
113	乌鲁木齐绕城高速公路(东线)工程	新疆维吾尔自治区交通建设管理局	水保函[2011]121号	2015-9-21	交通运输部科学研究院	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成5%。开展了水土保持监测和监理。应做好水土保持后续设计，加快全线取土场整治，对全线弃渣进行全面排查，全面落实弃渣场的防治措施，及时完善取、弃土场水土保持措施变更相关手续。		
114	华能轮台电厂(2×350MW)热电联产工程	华能新疆能源开发有限公司	水保函[2011]371号	2015-10-11	新疆水利水电科学研究院	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成65%，植物措施完成60%。开展了水土保持监测和监理。应加快水土保持措施及灰坝建设进度。		


黄河流域（片）大型生产建设项目建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
115	国电库尔勒 2×350MW热电联产 项目工程	国电库尔勒发电有 限公司	水保函 [2012]45号	2015-10-11		正在开展“四通一平”。应做好施工过程中压盖、洒水等临时防护措施，尽快开展水土保 土保持监测和监理工作。		
116	国投哈密电厂一期 (2×660MW)工程	国投哈密发电有限 公司	水保函 [2013]62号	2015-9-19	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成40%。开展了水土保 土保持监测。应加快植物措施建设进度，尽快清理厂区周边建筑垃圾，及时对运灰道路两 侧进行整治；切实规范水土保持监测和监理工作。		
117	国电哈密大南湖火电 一体化2×660MW 工程	国网能源哈密煤电 有限公司	水保函 [2013]181号	2015-9-18	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成30%。开展了水土保 土保持监测和监理。应加强施工管理，严禁乱堆乱弃、乱压乱占；及时实施厂外临建工 程区和厂区北边坡防护措施，抓紧落实砾石压盖和植物措施；切实规范水土保持监测 和监理工作。		
118	国网能源哈密电厂 4×660MW工程	国网能源哈密煤电 有限公司	水保函 [2013]184号	2015-9-18	新疆维吾尔自治区水 土保持生态环境监测 总站	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施尚未实施。开展了水土 保持监测。应加快植物措施实施进度，完善临时防护措施，尽快完成厂外道路防治区 土地整治，及时拆除施工生产生活区临建设施，做好水土保持设施验收准备。		
119	乌鲁木齐市轨道交通 1号线工程	乌鲁木齐市轨道交 通集团有限公司	水保函 [2013]252号	2015-9-21	黄河水利委员会绥德 黄土保持科学试验站	主体工程完成35%，水土保持工程措施完成30%，植物措施尚未实施。开展了水土 保持监测和监理。应加强拦挡、苫盖等临时防护措施，做好车站区表土剥离及保护工 作；切实规范水土保持监测和监理工作；依法缴纳水土保持补偿费。		
120	新疆国信佳东 2×660MW煤电项目	新疆国信煤电能源 有限责任公司	水保函 [2014]23号	2015-10-9	新疆吉翔工程建设咨 询监理有限责任公司	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成40%，植物措施完成10%。开展了水土 保持监测和监理。应加强施工管理，减少扰动破坏，杜绝随意堆弃；加快植物措施实 施进度，及时落实各项水土保持措施；尽快履行贮灰场变更手续。		
121	新疆西黑山矿区将军 戈壁二号露天煤矿二期 工程	新疆天池能源有限 责任公司	水保函 [2014]71号	2015-10-9	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成50%，水土保持工程措施实施进度，减少扰动破坏，杜绝不按规定措 施，尽快履行排土场变更相关手续。		
122	新疆三塘湖~哈密 750kV输变电工程	国网新疆电力公司	水保函 [2014]79号	2015-10-10	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成75%，水土保持工程措施完成75%，植物措施完成20%。开展了水土 保持监测和监理。水土保持“三同时”制度落实不到位。未开展水土保持后续设计， 植物措施实施滞后，部分区域施工现场零乱，随意扰动，临时防护措施不到位，水土 保持监测和监理工作不规范。应全面整改。		
123	圣雄能源托克逊工业 园热电(2台30万千瓦) 项目	新疆能源股份有限 公司	水保函 [2014]119号	2015-10-12	中国科学院水利部水 土保持研究所	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成85%。应尽快完善厂 区植物措施，清理零星弃土弃渣，加快实施裸露地防护措施，做好水土保持设施验 收准备。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况	备注
124	新疆广汇新能源有限公司白石湖露天煤矿	新疆广汇新能源有限公司	水保函[2014]244号	2015-10-10	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成55%。开展了水土保持监测和监理。应加快厂区外边坡整治，完善弃渣场边坡、围堰防护措施，清理零星弃土弃渣；切实规范水土保持监测和监理工作。	
125	新疆五彩湾—芨芨湖—三塘湖750千伏输变电工程	国网新疆电力公司	水保函[2014]246号	2015-10-10	水利部水土保持监测中心	主体工程完成60%，植物措施未实施。开展了水土保持监测和监理。制度落实不到位。未开展水土保持后续设计；植被措施实施严重滞后；部分区域施工现场零乱，随意扰动，临时防护措施不到位；水土保持监测和监理工作不规范。应全面整改。	
126	新疆哈密大南湖矿区西区大南湖七号矿井	国投哈密能源开发有限责任公司	水保函[2014]389号	2015-9-19		主体工程完成15%，水土保持工程措施完成15%，植物措施完成15%，目前项目停工。开展了水土保持监理，未开展水土保持监测。应做好水土保持措施，做好苫盖、洒水等临时防护措施。	停工
127	徐矿集团哈密能源有限公司大南湖矿区西区五号4.0Mt/a矿井	徐矿集团哈密能源有限公司	水保函[2014]417号	2015-9-18	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成20%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成2%。开展了水土保持监测和监理。存在施工现场混乱、随意扰动、乱堆乱弃、乱占乱压，未开展水土保持后续设计，排矸场及水土保持措施建设滞后，临时措施不到位，水土保持监测和监理工作不规范等问题。应全面整改。	

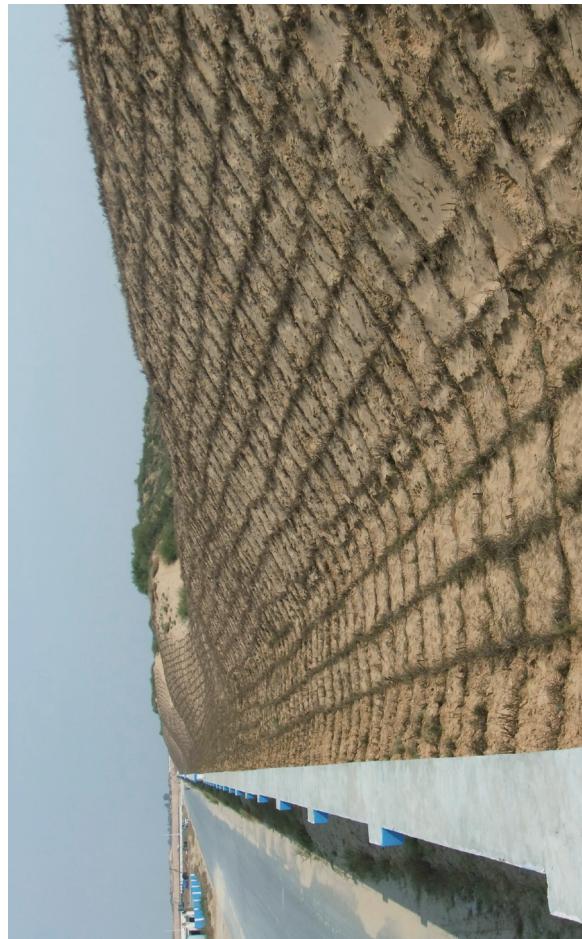

公路边坡沙障防护



输电线路塔基区复垦

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
						十二、黄委跟踪检查项目		
1	青海省引大济湟水总干渠工程	青海省引大济湟建 设管理局	水保函 [2009]440号	2015-7-19	黄河水利委员会西峰 水土保持科学试验站	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理。植物措施进度滞后；部分施工区域有堆土、堆渣未及时清理整治或采取临时防护措施。应抓紧落实各项水土保持措施，并收集整理水土保持档案资料，做好水土保持设施验收准备。		
2	国家高速北京至拉萨线西宁南绕城公路工 程	青海省高等级公路 建设管理局	水保函 [2012]55号	2015-7-18	黄河流域水土保持生 态环境监测中心	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成76%，植物措施完成34%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃渣场设计不合理，不符合水土保持要求，存在水土流失现象；部分弃渣场未按要求进行削坡开级，形成高陡边坡；弃渣场及施工便道形成的高陡、裸露边坡较多，未采取有效防护措施；部分弃渣场外有临时堆土、堆渣，未及时清理整治。应抓紧完善和落实弃土弃渣场的各项防护措施，加快植物措施实施进度，并按要求报告整改情况。		
3	新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线（甘青段）	兰新铁路甘肃有限公司	水保函 [2010]308号	2015-7-21	黄河流域水土保持生 态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成98%。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分弃渣场水土保持措施不完善，质量不复合要求，特别是弱风化口隧道弃渣场未采取任何水土保持措施，存在水土流失隐患；部分施工便道、施工生产生活区水土保持措施不到位，形成裸露面或边坡，未及时防护。应抓紧排查沿线弃土弃渣场，按照设计要求和标准抓紧完善各项防治措施。		
4	新建铁路兰州至重庆新线（甘肃段）	兰渝铁路有限责任公司	水保函 [2009]78号	2015-5-31	甘肃省绿华生态工程 咨询有限公司	主体工程完成97%，水土保持工程措施完成97%，植物措施完成40%。开展了水土保持设计、监测和监理。未认真落实历次水土保持监督检查意见。大部分弃渣场水土流失防治措施不完善，个别河道弃渣场未清理或清理不彻底，存在安全隐患；植物措施实施进度严重滞后；弃渣场等变更未履行相关手续。应抓紧整改，依法落实各项水土保持措施，缴纳水土保持补偿费。		
5	新建铁路天水至平凉线	天平铁路有限公司	水保函 [2009]173号	2015-5-29	甘肃省水土保持监测 总站	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成85%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃渣场、取土场的水土保持措施仍不完善，个别弃土（渣）场存在一定的安全隐患；部分已停用的施工生产生活区、临时便道清理不彻底；植物措施实施进度总体缓慢，部分已实施的植物措施成活率偏低；水土保持档案资料不完善。应抓紧整改，切实落实各项水土保持措施，消除安全隐患；加强已建水土保持设施管护；依法缴纳水土保持补偿费；做好水土保持设施验收准备。		
6	新建铁路宝鸡至兰州客运专线（天水—一定西段）	兰新铁路甘肃有限公司	水保函 [2010]318号	2015-5-31	黄河流域水土保持生 态环境监测中心	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成86%，植物措施完成39%。开展了水土保持设计、监测和监理。对历年检查意见落实较好。仍存在个别施工临时便道随意加宽扰动，部分渣场削坡开级、排水等措施不完善，个别弃渣场存在弃渣溢出现象，有的弃渣场防治设施遭破坏，植物措施实施相对滞后等问题。应抓紧整改，完善各项工作水土保持措施；切实做好水土保持资料收集和归档工作；依法缴纳水土保持补偿费；按要求报告水土保持方案实施进展。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保 持监 测单 位	2015年水土保持工作开展情况		备注
7	兰州市城市轨道交通1号线（陈官营-东岗段）工程	兰州轨道交通建设管理办公室	水保函[2012]344号	2015-6-2	甘肃省水土保持科学研究所	主体工程完成24%，水土保持工程措施完成15%，植物措施完成10%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分站场和施工便道的临时排水沟、沉砂池未建设；部分裸露地面苫盖不全面，一些临时堆土围挡不严密。应抓紧完善各项水土保持措施，落实水土保持方案实施情况报告制度，依法缴纳水土保持补偿费。		
8	改建铁路干塘至武威南铁路增建二线（甘肃段）	兰州铁路局干塘至武威南第二线工程建设指挥部	水保函[2013]181号	2015-6-4		主体工程完成45%，水土保持工程措施完成36%，植物措施完成14%。未开展水土保持设计和监测。取弃土场位置和数量发生重大变更，但未履行变更手续；工程沿线存在大量零散堆土未防护，未按要求实施表土剥离措施；部分已停用的取土场尚未落实水土保持措施，存在一定的安全隐患。应抓紧整改，并完成取弃土场水土保持设计，全面落实各项水土保持措施，依法缴纳水土保持补偿费。		
9	宁夏发电集团有限公司积家井矿区银星一井及洗煤厂	宁夏银星煤业有限公司	水保函[2010]325号	2015-8-11	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程已完工，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成85%。开展了水土保持设计、监测和监理。存在工业厂区回填边坡及排水措施不完善，排矸场措施不到位，进场道路边坡植物措施成活率低等问题。应完善排矸场变更手续；对照水土保持方案严格落实各项水土保持措施；按要求及时报告水土保持工作进展；依法缴纳水土保持补偿费；做好水土保持设施验收准备。		
10	宁夏固原地区（宁夏中南部）城乡饮水安全工程	宁夏水务投资集团	水保函[2011]360号	2015-8-12	宁夏回族自治区水土保持生态环境监测总站	主体工程完成76%，水土保持工程措施整体滞后，尤其是植被措施未按要求开展；部分施工道路和施工场地有零散堆土未清理平整；临时防护措施不完善。应严格落实水土保持方案确定的各项水土保持措施，按要求及时报告水土保持工作进展，依法缴纳水土保持补偿费，做好水土保持设施验收准备。		
11	神华宁夏煤业集团有限责任公司金家渠煤矿	神华宁夏煤业集团金家渠煤矿筹建处	水保函[2012]143号	2015-8-13	云南润滇节水技术推广咨询有限公司	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成30%。开展了水土保持设计、监测和监理。水土保持措施严重滞后；临时防护措施不完善，尤其是植物措施严重滞后；临时防护措施实施进度慢，严格落实各项目水土保持措施；依法缴纳水土保持补偿费；按要求及时报告水土保持进展。		
12	内蒙古呼和浩特抽水蓄能电站	内蒙古呼和浩特抽水蓄能发电有限责任公司	水保函[2005]423号	2015-7-10	内蒙古自治区水土保持监测站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。2#弃渣场形成高陡边坡，不符合水土保持要求；部分弃渣场排水设施不完善，渣顶面和坡面存在水土流失现象；道路两侧和弃渣场外存在弃土弃渣，未及时清理整治，道路施工形成的裸露边坡未及时防护。应抓紧整改，落实各项水土保持措施，并收集整理水土保持档案资料，做好水土保持设施验收准备。		
13	内蒙古汇能集团鄂尔林免煤炭有限公司鄂尔林免矿井及选煤厂	内蒙古汇能集团鄂尔林免煤炭有限公司	水保函[2009]400号	2015-7-6	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成95%，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成90%。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。场外道路水土保持措施不断完善；风井场地外边坡截水沟两侧裸露面积较大，未采取植物措施，排矸场排水系统不完善。应尽快落实各项水土保持措施，做好水土保持设施验收准备。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
14	新建张家口至呼和浩特铁路（内蒙古段）	蒙冀铁路有限责任公司	水保函[2010]416号	2015-7-11	中国水利水电科学研究院	主体工程完成44%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成10%。开展了水土保持设计、监测和监理。水土保持工作严重滞后，植物措施基本未开展；个别弃渣场选址不合理，未及时清理；施工过程中，临时防护措施不到位。应抓紧整改，及时落实各项水土保持措施。		
15	内蒙古伊泰广联煤化有限公司红庆河矿井及选煤厂工程	内蒙古伊泰广联煤化有限责任公司	水保函[2011]91号	2015-7-7	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成90%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理。进场道路水土保持措施不完善；工业场地各项水土保持措施总体滞后；弃土场、河道改造、生态水池、铁路专用线等附属工程水土保持措施不到位。应加快水土保持工作步伐，及时落实各项水土保持措施，并按要求报告整改情况。		
16	新建立铁路准格尔至鄂尔多斯铁路	呼准鄂铁路有限责任公司	水保函[2011]340号	2015-7-9	内蒙古自治区水利科 学研究院	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。水土保持措施总体滞后；有些施工场地比较凌乱，存在乱堆乱弃现象，且未采取临时防护措施；部分弃土场水土保持设计滞后，影响水土保持工作进展。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并按要求报告水土保持工作进展。		
17	国家高速公路网北京—乌鲁木齐公路临河至白疙瘩段（巴彦淖尔境内）	巴彦淖尔市交通运输局	水保函[2011]357号 水保函[2012]171号	2015-7-12	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成30%，水土保持措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。未按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施；水土保持监测和监理工作滞后；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并按要求报告水土保持工作进展。		
18	国家高速公路网北京—乌鲁木齐公路临河至白疙瘩段（阿拉善盟交通运输局境内）	阿拉善盟交通运输局	水保函[2012]171号	2015-7-14	北京华夏山川生态环境科技有限公司	主体工程完成30%，水土保持措施尚未实施。开展了水土保持监测和监理。未按批复的水土保持方案落实各项水土保持措施；水土保持监测和监理工作滞后；未缴纳水土保持补偿费。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并按要求报告水土保持工作进展。		
19	东胜气田天然气产能建设工程	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函[2013]246号	2015-7-9	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成5%，水土保持工程措施被吹毁效果差，形成大面积裸露地表或边坡：1号集气站站场边坡水土保持措施不完善，裸露边坡未采取有效措施进行防护；2号集气站站场边坡苦盖不全面，形成裸露边坡；进场道路水土保持措施未实施；部分管线防治区植物措施不完善，沙障内未实施植物措施或成活率低。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并按要求报告水土保持工作进展。		
20	大牛地气田大8-大98井区天然气开发项目（内蒙古境内）	中国石油化工股份有限公司华北分公司	水保函[2014]66号	2015-7-9	黄河水利委员会绥德水土保持科学试验站	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。部分井场裸露面积较大，砾石压盖密度小；部分站场未按要求实施植物措施，或布设的沙障植物措施成活率不高；部分道路两侧存在零星堆土，未及时清理平整；管线防治区植物措施不完善，成活率不高。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并按要求报告水土保持工作进展。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保 持监 测单 位	2015年水土保持工作开展情况		备注
21	陕西中太能源投资有限公司朱家峁矿井及选煤厂	陕西中太能源投资有限公司	水保函[2009]235号	2015-7-4	黄河水利委员会绥德 水土保持科学试验站	主体工程完成60%，水土保持工程措施完成50%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理。施工现场仍存在大面积裸露地表，临时防护措施不到位，部分高陡边坡未实施任何防治措施；未落实水土保持方案确定的排矸场，临时排矸场未落实临时挡墙、排水等措施；水土保持监测和监理未有效发挥作用。应抓紧整改，严格落实水土保持方案确定的各项水土保持措施；进一步规范和加强水土保持监测和监理工作；按要求报送水土保持监测报告和水土保持方案实施进展。		
22	国家高速公路包头至茂名线（G65）陕西境铜川至黄陵高速公路工程	陕西省高速公路建设集团公司	水保函[2010]240号	2015-7-8	黄河流域水土保持生态环境监测中心	主体工程完成94%，水土保持工程措施完成90%，植物措施完成75%。开展了水土保持设计、监测和监理。基本落实了2014年监督检查意见。一些弃渣场水土保持措施还不完善，部分弃渣场植物措施尚未实施，水土保持档案资料不完善。应对照水土保持方案，查漏补缺，加快落实各项水土保持措施；认真做好水土保持档案资料的收集、整理和归档工作；及时开展水土保持自查初验，做好水土保持设施验收准备。		
23	国家高速公路包茂线黄陵至延安扩能工程高速公路工程	黄延高速公路扩能 工程建设管理处	水保函[2011]119号	2015-7-7	中国科学院水利部水 土保持研究所	主体工程完成70%，水土保持工程措施完成60%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理。水土保持设计严重滞后；对表土剥离、临时拦挡、堆土苫盖等预防保护措施落实不到位；弃土弃渣场位置和数量发生很大变化，尚未履行变更手续，个别弃渣场存在安全隐患；施工现场随意弃土弃渣现象较为严重，弃土弃渣场仍存在较多的高陡裸露边坡；监测报告制度和水土保持方案实施情况报告制度未落实到位。应抓紧整改，完善手续，落实措施，消除隐患，加强和规范监测工作，全面履行水土保持报告制度。		
24	陕西省引汉济渭工程	陕西省引汉济渭工 程建设有限公司	水保函[2012]128号	2015-7-9	北京华夏山川生态环境 科技有限公司	主体工程完成45%，水土保持工程措施完成36%，植物措施完成12%。开展了水土保持设计、监测和监理。弃渣场工程措施进度缓慢，特别是临时周转渣场防治措施不完善，存在一定隐患；施工现场存在大面积扰动地表裸露现象、临时防护措施不完善，水土保持监测资料不全面，监测报告制度未落实到位。应抓紧整改，完善各项水土保持措施；进一步规范水土保持监测和监理工作；落实水土保持设施验收准备。		
25	大牛地气田（大8、大10、大65井区）天然气产能建设工程（陕西境内）	中国石油化工股份有限公司华北公 司	水保函[2012]371号	2015-7-4	北京华夏山川生态环境 科技有限公司	主体工程完成98%，水土保持工程措施完成85%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理。植物措施相对滞后，部分已实施的植物措施成活率不高；个别道路两侧仍有零星堆土，部分道路区硬地表裸露及堆存等预防保护措施不完善，存在一定隐患；施工现场存在大面积扰动地表裸露现象、临时防护措施不完善，水土保持监测制度落实不到位；水土保持方案实施情况报告制度未落实。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施，做好水土保持设施验收准备。		
26	宁东—浙江±800kV特高压直流输电工程（陕西段）	国网陕西省电力公司	水保函[2013]143号	2015-7-6	陕西绿馨水土保 持有限公司	主体工程完成50%，水土保持工程措施完成20%，植物措施完成10%。开展了水土保持监测和监理。水土保持工程后续设计严重滞后；对表土剥离及堆存等预防保护措施落实不到位；水土保持工程和植物措施相对滞后，部分塔基和施工道路的边坡裸露，在安全隐患；部分塔基未及时进行土地整治并恢复植被；水土保持临时措施基本未实施；水土保持报告制度未有效发挥作用；水土保持方案实施进展。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施，按要求报告水土保持方案实施进展。		

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保持 监测单位	2015年水土保持工作开展情况		备注
27	宁东—浙江±800kV特高压直流输电工程（山西段）	国网山西省电力公司	水保函[2013]143号	2015-10-21	北京北林丽景生态环 境规划设计院有限公司	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成25%。开展了水土保持监测和监理。部分山区塔基边坡过陡、裸露，场地平整不彻底，截排水措施不完善；部分牵张场周边的裸露边坡无防护措施；部分施工道路排水设施不完善，防治措施不到位；植物措施落实严重滞后。应抓紧整改，及时报告整改情况，并加强水土保持资料管理，做好水土保持设施验收准备。		
28	新建山西中南部铁路通道（山西段）	晋豫鲁铁路通道股份有限公司	水保函[2010]303号	2015-10-23	黄河水利科学研究院	主体工程已完工，水土保持工程措施完成98%，植物措施完成95%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。2014年监督检查意见大部分得到了落实，但仍存在部分弃土弃渣场、取土场、施工道路等防治区排水设施不完善、边坡防护不到位和植物措施不达标等问题。应抓紧整改，及时报告整改情况，依法缴纳水土保持补偿费，并做好水土保持设施验收准备。		
29	新建太兴铁路太原至兴县段工程	山西太兴铁路有限责任公司	水保函[2011]180号 水保函[2011]131号	2015-10-23	黄河水利委员会绥德 水土保持科学试验站	主体工程已完工，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成50%。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。未能全面落实2014年监督检查意见，部分弃土弃渣场尚未开展治理，已开展治理的弃土弃渣场防治措施不全面或未达到防治标准；多数地方植物措施尚未实施，已实施的植物措施标准较低。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，并及时报告整改情况。		
30	国电沁源太岳山25万千瓦风力发电项目	国电山西兴能有限公司	水保函[2012]321号	2015-10-25	中国科学院水利部水 土保持研究所	主体工程完成80%，水土保持工程措施完成70%，植物措施完成70%。开展了水土保持监测和监理。存在边坡高陡裸露、拦挡措施和排水设施不完善、扰动面大、植被恢复效果不理想等问题；新增的电缆敷设区表层裸露，无防治措施。应抓紧整改，全面落实各防治区水土保持措施，及时报告整改情况。		



煤制油项目厂区绿化

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持公报

黄河流域（片）大型生产建设项目水土保持工作情况

编 号	项目名称	项目法人或 建设单位	水土保持方案 批复文号	检查时间	水土保 持监 测单 位	2015年水土保持工作开展情况		备注
31	山东国电泰安热电厂“上大压小”新建项目	山东国电泰安热电厂	水保函[2012]80号	2015-6-10	淮河水利委员会淮河流域水土保持监测中心站	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%，植物措施完成70%。开展了水土保持设计、监测和监理。部分弃土弃渣边坡防护及截排水措施不完善，临时苫盖和拦挡等临时防护措施不到位；铁路专用线部分完工段边坡未及时采取水土保持措施。应抓紧整改，严格落实水土保持方案确定的各项水土保持措施。		
32	新建铁路兰州至乌鲁木齐第二双线（新疆段）	兰新铁路新疆有限公司	水保函[2010]308号	2015-9-15	北京交通大学	主体工程已完工，水土保持工程措施基本完成，植物措施完成80%。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。部分取土场治理不符合水土保持要求；新增和变更的弃土弃渣场未按要求征求水行政主管部门意见，个别弃土弃渣场选址不合理；部分弃土弃渣场未按要求落实拦挡工程等防治措施和进行砾石压盖；部分施工扰动区恢复治理不符合要求。应抓紧整改，全面落实各项水土保持措施，消除水土流失尤其是风蚀隐患。		
33	新建额济纳至哈密铁路（新疆段）	临策铁路有限责任公司	水保函[2011]41号	2015-9-17	黄河水利委员会绥德黄河保持科学试验站	主体工程完成85%，水土保持工程措施完成80%。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。施工过程中随意扩大施工范围，形成大量松散扰动地表，多数取土场治理不符合要求，尤其是周边不规则和平整不达标问题突出；部分涵洞下游冲刷现象严重，存在水流失现象；部分路基段乱堆乱弃现象严重，路基边坡土壤松散裸露，风蚀严重。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施，并按要求报告整改情况。		
34	新建铁路新疆红柳河至淖毛湖铁路	新疆红淖三铁路有限公司	水保函[2012]409号	2015-9-15	黄河水利委员会天水水土保持科学试验站	主体工程完成93%，水土保持工程措施完成80%。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。存在超范围扰动现象，形成松散裸露地表。应抓紧整改，严格落实各项水土保持措施，并按要求报告整改情况。		
35	新疆天富合盛2×330MW热电联产园区电站工程	新疆西部天富合盛热电有限公司	水保函[2013]442号	2015-10-30	北京地拓科技发展有限公司	主体工程已完工，水土保持工程措施完成95%，植物措施完成95%。开展了水土保持监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。厂区存在裸露地表，苫盖、拦挡等临时防护措施不到位。应抓紧整改，查漏补缺，做好水土保持设施验收准备。		
36	新疆天富热电股份有限公司天河热电联产2×330MW热电联产工程	新疆天富热电股份有限公司	水保函[2013]454号	2015-10-29	新疆生产建设兵团水土保持监测总站	主体工程已完工，水土保持工程措施和植物措施基本完成。开展了水土保持设计、监测和监理，正在开展水土保持设施验收评估工作。应做好水土保持设施验收准备。	2015年11月25日水土保持设施通过验收。	

审 定：李春安

审 核：何兴照

主 编：李 典 王 健

副主编：熊维新 高健翎 姚进忠 张艳得 牛保安

郑明军 彭晓刚 张明斌 李鹏云 凌九平

曹泽红 张生龙

编 写：杜亚娟 祁永新 叶春梅 赵永强 王立明

汪江涛 雷 方 霍 建 周颖璞 田志芳

尹云鹏 许文华 牛志鹏 刘汉虎 高景晖

曹丽玫 付惠玲 边 峰 杜 卿 李 昊

刘海燕 李向阳 刘琼海 蔡小春 张 鉴

张金柱

